

분야별 공약사항 관리카드

변화의 중심 미추홀구
(사통팔달·환골탈태)

1-1-1 (교통행정과)		경인전철 지하화를 추진하겠습니다.				팀 장	최지애 (4301)
						담당자	오승완 (4305)
사업목표		남북 간 도시단절 해소, 상부공간 공원, 상업, 주거(역세권 청년임대주택 포함) 등 생활시설과 업무 시설 배치				추진율	70%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	국가	비예산			○		도시재생과

개 요

□ 사업목적

- 도시 인구 증가 및 생활권 확대, 도심의 개발 가용토지 감소와 철도 주변의 교통 정체, 소음·진동 등 환경문제 등으로 경인선 지하화 필요



- 사업구간: 인천역~구로역(27km, 21개 역)

□ 세부 추진계획

단 계	추진 기간	주요 내용	비 고
1단계	2022~2025	· 추진을 위한 법적 기반 마련 및 추진 · 국책사업 채택 추진 노력	
2~3단계	2026~2039	· 기본계획·기본 및 실시설계·공사·개통	

※ 3단계 사업 완료 후 교통정책과와 협의하여 도시재생 추진: 도시재생과

□ 기대효과

- 경인전철 지하화로 지상공간의 생활권·경제권 활성화
- 경인선으로 인한 지역 단절, 소음·진동, 노후 역사 및 철길 주변 미관 저해 등의 문제 해결

공약 조정 내역

- 2024년 1차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2024. 5. 17.
 - 조정내역: 사업계획, 추진계획, 확인지표 등 변경
 - 조정사유: 「철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법」이 시행됨에 따라 연도별 추진계획 및 확인지표 변경

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 경인선 지하화 및 상부 개발 추진전략 수립 용역 착수(市)	10%
2023년	• 경인선 지하화 및 상부 개발 추진전략 수립 용역 추진(市) • 철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법 제정(국토부)	30%
2024년	• 국가종합계획 수립 착수(국토부)	50%
2025년	• 국가종합계획 수립 완료(국토부)	70%
2026년	• 인천광역시 기본계획 수립	100%
임기 후 (2~3단계)	• 기본계획·기본 및 실시설계·공사·개통	

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
경인선 지하화 수립 용역 (市)	목표	2건	착수	추진				
	실적	2건		착수	완료			
특별법 제정(국토부)	목표	1건		제정				
	실적	1건		발의	제정			
국가종합계획 수립 (국토부)	목표	반영			착수	반영		
	실적	신청			착수	수립 중		
인천광역시 기본계획 수립 (市)	목표	1건					착수	반영
	실적	착수					착수	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2023. 1월: 경인전철 지하화 추진전략 수립 용역 착수(市)(2023. 1. 18.~2024. 12. 20.)
- 2023. 4월: 경인전철 지하화 추진전략 수립 용역 착수보고회 개최(市)
- 2023. 9월: 철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법 발의(국토부)
- 2024. 1월: 철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법 제정(국토부)
- 2024. 3월: 철도지하화 통합개발 종합계획 수립 용역 착수(국토부)
- 2024.10월: 철도지하화 선도사업 제안서 제출(市)
- 2024.12월: 경인전철 지하화 추진전략 수립 용역 준공(市)
- 2025. 2월: 경인선 철도지하화 선도사업 미선정(국토부)
- 2025. 3월: 수도권 철도지하화 마스터플랜 전담 조직 구성(국토부, 인천, 서울, 경기)
- 2025. 4월: 경인전철 지하화 통합개발 사업화계획 수립 용역 착수(市)
(2025. 4. 15.~2028. 3. 31.)
- 2025. 5월: 경인선 철도지하화 통합개발 사업제안서 제출(국토교통부)
- 2025. 6월: 경인전철 지하화 통합개발 사업화계획 수립 용역 착수보고회 개최

향후 추진계획

- 2026년 국가종합계획 수립(국토부)
 - ※ 국토교통부의 국가종합계획 수립 지연으로 2025년 12월 말에서 2026년 상반기로 변경
- 2025년~2028년 인천광역시 기본계획 수립

투자계획

비예산

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	9,540,800	0	0	0	0	0	9,540,800	-
국비	9,540,800	-	-	-	-	-	9,540,800	-

※ 경인선 지하화 총사업비(9,540,800백만 원) 중 미추출구 구간만 특정할 수 없어 비예산으로 변경

■ 신문보도(인천일보, 2025. 12. 30.) - 해 넘기는 국가철도망 계획 발표...인천 사업들 담보
 ... '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)'과 '철도 지하화 통합개발 종합계획' 발표일이 내년으로 연기됐다. 당초 국토교통부는 올 연말에 이들 계획을 확정·고시할 예정이었다. ...
 ... 국토부 관계자는 "전국 지자체에서 건의한 사업이 많아서 검토하는 데 시간이 걸리고 있다"며 "구체적 발표 시기를 확정할 순 없지만 내년 상반기를 목표로 최대한 속도를 내고 있다"고 말했다.

1-2-1 (도시재생과)		인천대로 종점까지 지하화를 추진하겠습니다.				팀 장	김중호 (7471)
사업목표		동서 간 도시단절 해소, 도심 숲 조성, 시민 휴식 공간 제공, 주차장 조성				담당자	길경자 (7474)
추진율		54%					
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	인천시	1,612,336			○		市 인천대로개발과

개 요

인천대로 일반화(인천숲길 조성)

- 사업규모: 10.45km
 - 1-1단계: 인천기점(용현동)~독배로(인하대학교) 인근
 - 1-2단계: 독배로(인하대학교) 인근~주안산단고가교
 - 2단계: 주안산단고가교~서인천 IC
- 사업기간: 2016년~2030년
- 총사업비: 5,936억 원

인천대로 지하도로화

- 사업규모: 9.7km
 - 1단계: 주안산단고가교~서인천 IC
 - 2단계: 인천기점(용현동)~주안산단고가교
- 사업기간: 2022년~2035년
- 총사업비: 1조 187억 원(1단계 6,123억 원, 2단계 4,064억 원)

추진기간(년)	주요내용		비 고
	일반화	지하화	
2022~2026	1-1단계 착공 및 준공, 1-2단계 착공 및 준공, 2단계 착공	1단계 착공, 2단계 사전타당성조사 착수	
2027~2035 (임기 후)	2단계 준공	1단계 준공, 2단계 착공 및 준공	

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)		추진율
	일반화	지하도로화	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> • 1-1단계 실시계획인가 및 착공 • 1-2단계·2단계 실시계획인가 	<ul style="list-style-type: none"> • 1단계 예비타당성조사 착수 및 완료 	5%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 1-1단계 공사 추진 • 1-2단계 실시계획인가 고시 • 1-2단계 착공(→'24년도 추진) • 2단계와 지하도로 1단계 통합 추진 결정 • 2단계 착공(→'25년도 추진) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1단계 기본계획 수립 및 설계 <ul style="list-style-type: none"> - 일반화 2단계와 통합 추진 결정 • 2단계 사전타당성조사 착수 	20%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> • 1-1단계 공사 추진 • 1-2단계 착공 	<ul style="list-style-type: none"> • 1단계 착공(→'25년도 추진) • 2단계 사전타당성조사 완료 • 2단계 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 신청 	30%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> • 1-1단계 준공(→'26년) • 1-2단계 준공(→'27년) • 2단계 착공(지하도로화 1단계와 통합 추진) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1단계 실시계획 착수 • 1단계 착공(일반화 2단계와 통합 추진) 	50%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> • 2단계 공사 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 1단계 공사 진행 	100%
임기 후	<ul style="list-style-type: none"> • 2단계 준공 	<ul style="list-style-type: none"> • 1단계 준공 • 2단계 착공 및 준공 	

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
실시계획인가	목표	3건	3건					
	실적	3건	3건					
착공	목표	4건	일반화 (1-1)	일반화 (1-2)	일반화 (2)			지하화 (2)
	실적	3건	일반화 (1-1)	-	일반화 (1-2)	일반화 (2)		-
준공	목표	4건				일반화 (1-1),(1-2)		일반화(2) 지하화(2)
	실적	-				-		-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	54%		

※ 일반화 2단계: 지하도로화 1단계와 통합 추진

추진실적

- 인천대로 일반화(인천숲길 조성)
 - 2017년: 기본계획 수립
 - 2019년: 기본설계 및 실시설계 추진
 - 2022년: 1-1단계 실시계획고시 및 착공
 - 2023년: 1-2단계, 2단계 실시계획고시
 - 2024년: 1-2단계 공사 착공, 2단계 지하도로화 1단계 통합 추진
 - 2025년: 1-1단계, 1-2단계 공사 추진
2단계 공사 착공(지하도로화 1단계 통합 추진)
- 인천대로 지하도로화
 - 2022년: 1단계 예비타당성조사 착수 및 준공
 - 2023년: 1단계 중앙투자심사 통과 및 기본계획 수립
2단계 사전타당성조사 착수
 - 2024년: 1단계 일반화사업 2단계와 통합 추진
2단계 사전타당성조사 준공
 - 2025년: 1단계 공사 착공(지하도로화 1단계 통합 추진)
2단계 제5차 혼잡도로 개선계획 반영 협의(인천시↔대광위)

향후 추진계획

- 인천대로 일반화(인천숲길 조성)
 - 2026년: 1-1단계 준공, 2단계 실시설계 및 가격협상
 - 임기 후: 1-2단계 준공(2027년), 2단계 준공(2030년)
- 인천대로 지하도로화
 - 2026년: 1단계(일반화 2단계 통합 추진) 실시설계 및 가격협상
2단계 혼잡도로 개선계획 반영
 - 임기 후: 1단계 준공(2030년), 2단계 착공 및 준공(2035년)


투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	1,612,336	-	38,890	47,560	27,782	68,884	1,429,220	183,116
국비	509,355	-	-	3,000	10,882	16,100	479,373	29,982
시비	1,102,981	-	38,890	44,560	16,900	52,784	949,847	153,134

- ※ (국비) 사업 추진계획 현실화에 따른 신청액 대비 예산 삭감(기재부)
※ 2024년 및 2025년도 국비 설계비만 반영(139억)
- ※ (시비:지하도로화) 국비 예산 삭감에 따른 시비 매칭 비용 조정
- ※ (시비:일반화) 사업 추진계획 현실화에 따른 신청액 대비 예산 삭감(인천시)

관련 사진

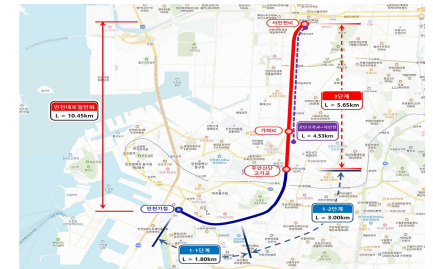

1-3-1 (교통행정과)		인하대역~인천터미널역 지하철 노선 신설을 추진하겠습니다.				팀 장	최지애 (4301)
						담당자	오승완 (4305)
사업목표		인하대역~인천터미널역 지하철 노선 신설 추진				추진율	60%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	인천시	600,000			○		

개 요

□ 사업목적

- 인천의 도시철도가 남북 종단형으로 건설되어 있어 미추홀구는 광역교통망 사각지대에 놓여있으며, 용현·학익지구를 중심으로 도시재생사업이 활발히 추진되면서 그에 따른 교통 대책 마련 필요



- 사업구간: 인하대역~학익법조타운~인천터미널역(L=5.1km)

□ 세부추진계획

단 계	추진기간(년)	주요내용	비 고
1단계	2022~2026	• 제2차 인천 도시철도망구축계획 반영	
2, 3단계	2027~	• 예비타당성조사·기본계획·기본 및 실시설계·공사·개통	

□ 기대효과

- 학익법조타운은 수도권에서 유일하게 지하철 노선이 없는 만큼 대규모 주택단지가 들어선 수인선 인하대역과 종합터미널 연결 가능

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 추진을 위한 제도적 기반 마련	10%
2023년	• 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 용역을 위한 수요조사(市) • 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 발주(市)	30%
2024년	• 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인 신청(市→국토부)	60%
2025년	• 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)	100%
2026년 ~임기 후	• 예비타당성조사·기본계획·기본 및 실시설계·공사·개통	

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
철도 관련 공약사항 검토 요청 (미추홀구→市)	목표	1건					
	실적	1건					
도시철도망구축계획 수요조사(市)	목표		1건				
	실적		1건				
도시철도망구축계획 용역 발주(市)	목표		발주				
	실적	완료	발주	추진	추진		
도시철도망구축계획 승인 신청(市→국토부)	목표			신청			
	실적			-	신청		
도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)	목표				승인		
	실적				-		
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	

추진실적

- 2023. 3월 인천 도시철도망구축계획 수립을 위한 수요조사에 따른 사업 요청 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 계약(市)
- 2023. 4월~ 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 진행 중(市 '23. 4. 3.~'26. 2. 2.)
- 2024. 12월 제2차 인천 도시철도망구축계획(안) 발표
- 노선명: (가칭)인천4호선 → 용현-서창선
- 2025. 2월~ 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인 신청(市 → 국토부)
관계 행정기관 협의 등 행정절차 이행, 국토교통부 심의위원회 미개최로 연기

향후 추진계획

- 2026년 2월 도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)
 ※ 도시철도망 구축계획 승인·고시 지연으로 당초 2025년 12월 말에서 2026년 2월로 변경

■ **신문보도(인천투데이, 2025. 12. 15.)** - '인천3호선·용현서상선' 제2차 인천도시철도망 승인 해 넘긴다
 인천도시철도3호선과 용현서상선이 포함된 제2차 인천도시철도망 구축계획 발표가 당초 예측됐던 올해 말에서 지연돼 해를 넘기는 것으로 파악됐다. ... 국토부 확인 결과, 제2차 인천도시철도망 승인은 실무위원회 절차는 마무리됐으나 마지막 절차인 국가교통심의위원회 심의가 끝나지 않아 연내 승인이 불가능한 것으로 파악됐다. 국토부 관계자는 “제2차 인천도시철도망 구축계획 실무위원회 절차는 이미 종료됐다”며 “현재는 국가교통심의위원회 심의만 남은 최종단계”라고 말했다. 이어 “국가교통심의위원회 연내 개최는 어렵고 빠르면 1월 초 개최 후 의견 회신, 지자체 보완, 재의결 절차를 거쳐 1월 말 최종 승인이 날 가능성이 크다”고 덧붙였다.

■ **신문보도(인천투데이, 2026. 1. 20.)** - 인천3호선·용현서상선 등 제2차 인천도시철도망 발표 2월로 밀려
 인천도시철도3호선 송도검단선과 용현서상선 등을 포함한 제2차 인천도시철도망구축계획 발표가 당초 예정보다 더 늦어지는 것으로 것으로 파악됐다. 15일 <인천투데이> 취재를 종합하면, 국토교통부는 1월 중순인 20일까지도 국가교통위원회 심의를 개최하지 않은 것으로 나타났다. ... 인천시가 건의한 도시철도망 내 도시철도는 7개다. 인천3호선 송도검단선과 용현서상선, 송도트램, 부평연안부두트램, 인천2호선 논현 연장, 영종트램, 가좌송도선이다. ... 제2차 인천도시철도망구축계획은 당초 1월 초 국가교통심의위원회 심의 후 1월 말 최종 승인 예정이었으나 국가교통심의위원회 개최가 지연되면서 승인 고시 역시 2월로 밀렸다.

■ **신문보도(기호일보 2026. 1. 20.)** - 인천 동서 잇는 '용현서상선' 내년 초 사업성 윤곽
 ... 인천시는 다음 달 초 용현서상선에 대한 사전 타당성 조사 용역을 발주할 계획이라고 20일 밝혔다. 1년간 진행될 이번 용역에서는 수요 예측과 비용 대비 편익(B/C) 분석, 사업 추진 방식 등을 종합적으로 검토한다. ... 용현서상선은 시가 수립한 '제2차 인천도시철도망 구축계획(2026~2035)'에 포함된 노선이다. 이 계획은 인천 전역을 연결하는 7개 노선, 총연장 123.96km 규모의 도시철도 확충 구상을 담고 있다. 현재 국토교통부의 최종 승인을 앞두고 있으며, 승인 시점은 다음 달 초로 예상된다. ...

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	600,000	0	0	0	0	0	600,000	-
국비	600,000	-	-	-	-	-	600,000	-

1-4-1 (건설과)	문학IC~도화IC 지하도로 건설을 추진하겠습니다.					팀 장	박대근 (4426)
						담당자	정우식 (4415)
사업목표		문학C~도화C 지하도로 건설 추진				추진율	60%
사업구분	사업주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	인천시	471,400			○		市 인천대로개발과

개요

- 사업구간: 문학IC~공단고가교
- 사업규모: 신설 4km(지하도로, 왕복 2~4차로(B=20m))
- 총사업비: 471,400백만 원
- 세부 추진계획

단 계	추진기간(년)	주요내용	비 고
1단계	2022~2026	· 사전타당성조사 용역 준공 · 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 반영 · 예비타당성조사 대상사업 신청	
2단계	2027~2030	· 공사 추진 및 완료	

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	· 2022. 5. 도시관리계획(시설: 지하도로) 결정용역 착수 · 2022. 6. 주변 개발 현황 및 지형도 등 기초자료 수집	15%
2023년	· 사전타당성조사 용역 착수	30%
2024년	· 사전타당성조사 용역 준공 · 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 신청(인천시→국토부)	50%
2025년	· 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 반영	70%
2026년	· 예비타당성조사 대상사업 신청	100%
임기 후	· 공사 추진 및 완료	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
도시관리계획(지하도로) 결정용역 착수	목표	착수	착수					
	실적	준공	착수	준공				
사전타당성조사 용역	목표	준공		착수	준공			
	실적	준공		착수	준공			
제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획	목표	반영			신청	반영		
	실적	협의			신청	협의		
예비타당성조사 대상사업 신청	목표	신청					신청	
	실적	-					-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 도시관리계획(시설: 지하도로) 결정용역 : 2022. 5월~2023. 1월
- 주변 개발 현황 및 지형도 등 기초자료 수집 : 2022. 6월
- 사전타당성조사 용역 착수 및 수행 : 2023. 3월~2024.12월
- 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 신청(시→국토부) : 2024. 7월
- 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 협의(시↔대광위) : 2024.12월~
- 국토연구원 업무협약(교통수요·사업비 분석결과 등 논의) : 2025. 3월
- 대광위·국토연구원·6대 광역시 실무협의회 : 2025. 6월
- 대광위 업무협약(실무협의회 시 요구사항 제출·설명) : 2025. 8월
- 대광위 업무협약(도로정책협의회 일정 등 동향파악) : 2025. 11월
- 기재부 합동실무회의 : 2025. 12월

향후 추진계획

- 2026. 3월~4월 도로정책심의위원회 심의 및 혼잡도로 개선계획 수립(대광위)
- 2026. 4월~5월 예비타당성조사 대상사업 신청
- 2027. 타당성 평가 및 기본계획 수립
- 2028. 기본 및 실시설계
- 2030.~2034. 공사 시행

■ 신문보도(기호일보, 2025. 12. 4.) - 인천 '남북 관통' 교통난 해소 문학~가좌 지하화 내년 윤곽
 ... 4일 국토교통부에 따르면 지난 7월 인천시가 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업 계획'에 반영을 요청한 문학나들목~가좌나들목 지하화 사업에 대해 기획재정부 등 관계부처와 협의를 진행 중이다.
 국토부는 적합성 검토를 마친 뒤 내년 하반기 5차 계획 반영 여부에 대해 공개할 예정이다. 당초 연말에 공개될 예정이었으나 협의가 지연되면서 일정이 미뤄졌다. ...

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					임기 후	확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026		
계	471,400	86	0	0	0	0	471,314	86
국비	235,700	-	-	-	-	-	235,700	
시비	235,786	86	-	-	-	-	235,614	86

※ 총사업비 변동 사유: 1. 공사 범위 증가(3km → 4km), 2. 공사비 현행화(10년 전 공사 금액: 254,700백만 원)

1-5-1 (교통행정과)		월판선 인천역까지 연장을 추진하겠습니다.				팀 장	최지애 (4301)
						담당자	오승완 (4305)
사업목표		월판선 인천역까지 연장 추진(송의역 정차)				추진율	60%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	인천시	95,000			○		

개 요

- 월곶~판교 복선전철 건설사업(국토교통부)
 - 사업구간: 송도~연수~월곶~시흥시청~광명~인덕원~판교(L=40.3km)
 - 사업기간: 2016년~2028년
 - 총사업비: 2조 1,752억 원



- 사업내용
 - 월판선을 인천역까지 연장 운행(시 → 국토교통부)
 - 사업구간: 송도역 → 인천역 연장(L=6.76km, 차량구입 6량 1편성)
 - 월판선을 인천역까지 연장 시 송의역(수인선) 정차 건의(구 → 시)

세부 추진계획

단 계	추진기간(년)	주요내용	비 고
1단계	2022~2026	· 월판선 인천역 연장 용역 및 건의	
2단계	2027~	· 월판선 인천역 연장 반영, 월판선 연장선 설계 · 월판선 연장 공사	

기대효과

- 인천역 주변 낙후한 원도심과 인천 내항 발전을 촉진하고 인천시민의 고속철도 이용 편의 증진

공약 조정 내역

- 2024년 1차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2024. 5. 17.
 - 조정내역: 추진계획, 확인지표 변경
 - 조정사유: 용역 결과, 경제성 부족으로 국토부에 건의가 불가함에 따라 인천역 일대 개발(제물포 르네상스 프로젝트) 시기에 맞춰 사업 추진하고자 추진계획 및 확인지표 변경

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	· 사전타당성조사 용역(市)	15%
2023년	· 사전타당성조사 용역 완료, 인천역 연장 건의(市→국토부, 국가철도공단) · 송의역 정차 건의(미추홀구→市) → '26년도에 인천역 연장 및 송의역 정차 건의 추진	30%
2024년	· 관계기관 협의(市→국토부, 국가철도공단)	60%
2025년	· 인천역 연장 타당성 재조사 착수(市)	80%
2026년	· 인천역 연장 타당성 재조사 완료(市) · 인천역 연장 건의(市→국토부, 국가철도공단) · 송의역 정차 건의(미추홀구→市)	100%
임기 후 (2단계)	· 인천역 연장 반영(국토부, 국가철도공단) · 월판선 연장 설계 · 월판선 연장 공사	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
사전타당성조사 용역(市)	목표	2건	착수	완료			
	실적	2건	착수	완료			
인천역 연장 건의 (市→국토부, 국가철도공단) [2026년 추진]	목표	1건		1건		1건	
	실적	-				-	
송의역 정차 건의 (미추홀구→市) [2026년 추진]	목표	1건		1건		1건	
	실적	-				-	
관계기관 협의 (市→국토부, 국가철도공단)	목표	1건			1건		
	실적	1건			1건		
인천역 연장 타당성 재조사	목표	2건			착수	완료	
	실적	-			-		
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	0%	

추진실적

- 2023. 2월: 월판선 KTX이음 인천발 KTX 인천구간 추가정차 사전타당성조사 용역 완료
- 2024. 9월: 추가 정차 관련 국토부 협의 실시

향후 추진계획

- 2026년 상반기 중 타당성 재조사 용역에 대한 비용을 국가철도공단에 납부 및 용역 착수 예정
- 사전타당성조사 재검토 후 현재 시행 중인 월판선 사업계획에 포함하여 국가사업으로 추진될 수 있도록 건의(市 → 국토부, 국가철도공단)
- 월판선을 인천역까지 연장 시 송의역(수인선) 정차 건의(미추홀구 → 市)

문제점 및 대책

- 용역 결과 월판선 인천역 연장사업의 경제성이 낮게 나옴에 따라 국토부에 건의가 불가한 사항으로, 인천역 일대 개발사업에 대한 추가 검토 등을 통해 경제성을 확보 후 인천역 연장사업 건의 예정(市)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	95,000	0	0	0	0	0	95,000	-
시비	95,000	-	-	-	-	-	95,000	-

1-6-1 (교통행정과)		송도~제물포역 교통체계를 개선하겠습니다.				팀 장	최지애 (4301)
						담당자	오승완 (4305)
사업목표		송도~제물포역 교통체계 개선				추진율	70%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	국가	1,679,100			○		

개 요

- 사업내용:** 인천가좌역(인천2호선)~제물포역(경인선)~인하대역(수인선) ~인천대입구역(GTX-B, 인천1호선) 경전철 설치 추진
- 사업규모:** 연장 15.03km, 정거장 12개소
- 세부추진계획**

단 계	추진기간(년)	주요내용	비 고
1단계	2022~2026	. 인천 도시철도망구축계획 변경 승인 . 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인	
2~3단계	2029~2038	. 예비타당성조사·기본계획·기본 및 실시설계·공사·개통	

- 기대효과:** 원도심 및 신도시의 활성화 등 지역 균형발전 도모



공약 조정 내역

- 2022년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2022. 9. 15.
 - 조정내역: 공약명, 세부 과제명 변경
(송도~주안역 지하철 노선 신설 → 송도~주안역 교통체계 개선)
 - 조정사유: 사업 추진 기간 및 사업 예산 등을 고려하여 주민들이 빠르게 체감할 수 있도록 교통체계 개선으로 변경함
- 2025년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 3. 10.
 - 조정내역: 공약명, 세부 과제명, 추진계획, 확인지표 등 변경
(송도~주안역 교통체계 개선 → 송도~제물포역 교통체계 개선)
 - 조정사유: 제2차 인천광역시 도시철도망구축계획(안) 상 주안~송도선 제외되고, 대안으로 가좌~송도선을 선정함에 따라 공약명, 사업계획 등 변경

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 인천 도시철도망구축계획 변경 승인	10%
2023년	• 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 착수	30%
2024년	• 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 진행 • 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인 신청(市→국토부): 2025년으로 연장	50%
2025년	• 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 추진 • 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인 신청(市→국토부)	70%
2026년	• 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)	100%
임기 후 (2~3단계)	• 예비타당성조사·기본계획·기본 및 실시설계·공사·개통	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
인천 도시철도망구축계획 변경 승인	목표	승인	승인					
	실적	승인	승인					
도시철도망구축계획 용역(市)	목표	완료		착수	추진	추진	완료	
	실적	추진		착수	추진	추진	-	
도시철도망구축계획 승인 신청(市→국토부)	목표	신청			신청	신청		
	실적	신청				신청		
도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)	목표	승인					승인	
	실적	-					-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

○ 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 계약(市)	: 2023. 3월
○ 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 추진(市) ('23. 4. 3.~'26. 2. 2.)	: 2023. 4월~2026. 2월
○ 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 공청회 개최 - 주안~송도선 대안으로 가좌~송도선 선정	: 2024. 12월
○ 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인 신청(市→국토부)	: 2025. 2월

향후 추진계획

- 2026년 2월 도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	1,679,100	0	0	0	0	0	1,679,100	-
국비	994,300	-	-	-	-	-	994,300	-
시비	662,800	-	-	-	-	-	662,800	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	22,000	-	-	-	-	-	22,000	-

※ 기타: 용현학익지구 광역교통개선대책에 따른 사업시행자 부담액

1-7-1 (교통행정과)		도심 주차난을 해소하겠습니다.				팀 장	최준구 (4516)
						담당자	이덕연 (4517)
사업목표		빈집 등을 활용한 주차장 설치 사업 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	4,686		○			도시정비과

개 요

□ 인구구조 변화, 도심 공동화 등으로 증가하는 빈집을 활용한 소규모 공영 주차장 설치 사업 추진

- 지역주민을 위한 소규모 공영주차장 조성 후 무료 운영
- 빈집 및 인접 주택 매입을 통한 주차장 조성
- 빈집 매입 및 주차장 건설(교통행정과), 빈집 철거(도시정비과 협조)
 - ※ 빈집 소유자 매각 미동의 시 조성 불가
 - ※ 부지 여건이 관련 법령상 주차장 설치 기준을 충족하여야 함

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 사업 추진 계획 수립 • 빈집 현황 조사(도시정비과, 동 행정복지센터 협조) 및 현장 실사	50%
2023년	• 현장 실사 및 빈집 소유주와 매입 협의, 감정평가 • 예산 편성, 빈집 매입 및 철거, 주차장 조성 10면	100%
2024년	• 현장 실사 및 빈집 소유주와 매입 협의, 감정평가 • 예산 편성, 빈집 매입 및 철거, 주차장 조성 5면	100%
2025년	• 현장 실사 및 빈집 소유주와 매입 협의, 감정평가 • 예산 편성, 빈집 매입 및 철거, 주차장 조성 5면	100%
2026년	• 현장 실사 및 빈집 소유주와 매입 협의, 감정평가 • 예산 편성, 빈집 매입 및 철거, 주차장 조성 5면	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
사업계획 수립	목표	1건	1건				
	실적	3건		1건	1건	1건	
소규모 부지 조사	목표	10개소	10개소				
	실적	16개소	16개소				
소규모 주차장 조성	목표	25면		10면	5면	5면	5면
	실적	474면		55면	146면	273면	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%

추진실적

- 2022. 10월: 소규모 주차장 부지 조사 9개소(7개소 부적합, 2개소 부지매입 예정)
- 2022. 12월: 소규모 주차장 부지 조사 7개소(3개소 부적합, 4개소 검토)
- 2023. 3월: 주안2동 551-12번지 일원 임시 개방형 주차장 조성, 17면(지평식)
- 2023. 6월: 도화2.3동 1007-1번지 임시 개방형 주차장 조성, 26면(지평식)
- 2023. 10월: 주안2동 497-14 외 4필지 임시 개방형 주차장 조성, 12면(지평식)
- 2024. 2월: 용현2동 686-13번지 임시 개방형 주차장 조성, 6면(지평식)
도화2.3동 765-19번지 임시 개방형 주차장 조성, 127면(지평식)
- 2024. 3월: 도화1동 520-10번지 임시 개방형 주차장 조성, 4면(지평식)
주안2동 498-6번지 임시 개방형 주차장 조성, 4면(지평식)
- 2024. 10월: 주안2동 510-30번지 소규모 공영주차장 조성, 5면(지평식)
- 2025. 6월: 용현5동 624-14 소규모 공영주차장 조성, 13면(지평식)
용현2동 556-35번지 임시 개방형 주차장 조성, 4면(지평식)
주안2동 555-7번지 임시 개방형 주차장 조성, 4면(지평식)
도화2.3동 991번지 임시 개방형 주차장 조성, 21면(지평식)
- 2025. 9월: 도화2.3동 567-12, 13번지 임시 개방형 주차장 조성, 16면(지평식)
- 2025. 10월: 도화1동 618-7번지 임시 개방형 주차장 조성, 9면(지평식)
- 2025. 11월: 주안동 867-9번지 공영주차장 확충 조성, 47면(지평식)
학익동 332-10번지 임시 개방형 주차장 조성, 14면(지평식)
미추8구역 임시 개방형 주차장 조성, 주차면 125면(지평식)
- 2025. 12월: 도화2.3동 1005-1번지 공영주차장 조성, 30면(지평식)

향후 추진계획

- 2026년 주안7동 1431-2번지 일원 소규모 공영주차장 조성, 22면(지평식)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	4,686	-	600	1,400	1,243	1,443	4,686
시비	1,943	-	-	700	100	1,143	1,943
구비	2,743	-	600	700	1,143	300	2,743

1-7-2 (교통행정과)

도심 주차난을 해소하겠습니다.

팀 장	최준구 (4516)
담당자	이덕연 (4517)

사업목표		학교 운동장 활용 지하 주차장 건설 추진				추진율	5%
사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	차체	23,000	공약 폐기				

개 요

- 사업명: 학교 운동장 지하 공영주차장 조성사업
- 사업주체: 인천시, 미추홀구, 인천남부교육지원청
- 사업대상: 학교 주변 주택가 밀집지역으로 주차난이 심각한 지역(문학정보고등학교)
- 사업방법: 주차난 등을 고려하여 대상 학교 선정(시 교통관리과)
- 선정결과: 최종 대상 학교 없음(사업 진행 방식 변경)
 - * (당초) 지하주차장 단일 방식 ⇒ (변경) 학교복합시설 공모사업(교육청 주관)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 학교 운동장 지하 주차장 조성 대상지 선정을 위한 사전 협의	5%
2023년	• 지하 주차장 조성 대상지 선정 → 미선정	30%
2024년	• 사전 행정절차 및 지하 주차장 설계용역 시행 → 추진 불가	50%
2025년	• 지하 주차장 공사 착공 → 추진 불가	70%
2026년	• 지하 주차장 공사 준공 및 주민 개방 → 추진 불가	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
대상지 선정을 위한 사전 협의	1개소	1개소					
지하 주차장 조성 대상지 선정	1개소		1개소				
사전 행정절차 및 설계용역 시행	1개소			1개소			
지하 주차장 공사 착공	1개소				1개소		
지하 주차장 공사 준공 및 주민 개방	1개소					1개소	-

추진실적

- 2023. 6월: 학교운동장 지하 공영주차장 타당성 조사 용역 수요 조사(市 교통안전과)
- 2023.12월: 학교운동장 지하 공영주차장 타당성 조사 방문 면담 실시(市 교통안전과)
- 2024. 2월: 학교운동장 지하 공영주차장 최종 대상 학교 미선정(市 교통안전과)

공약 조정 내역 : 공약 폐기

- 공약 폐기 검토 보고[교통행정과-228(2025. 1. 6.)호]
- 2025년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 3. 10.
 - 공약 폐기 사유
 - ① 대상 학교 미선정
 - (문학정보고등학교) 가용 면적 협소(70대 미만)로 사업 효과 미미
 - (학령인정 남인천중.고등학교)「학교복합시설법」상 학교의 범위에 해당되지 아니함
 - ② 사업 진행 방식 변경

구분	당초 인천시 검토(안)	용역 결과 후 인천시 검토(안)
사업주체	인천광역시 (광역자치단체)	마추출구 (기초자치단체)
사업방식	지하 주차장 단일 사업	학교복합시설 공모사업(주차장+체육/교육/문화/기타 편익시설)
사업비 부담	전액 인천광역시 부담	(시) 공영주차장 조성비 50% 지원 * 전체 사업비가 아닌, 공영주차장 조성비에 한함 (교) 총 사업비의 25% 지원 (구) 구 부담 = 총사업비-(교육청 지원)-(시 지원)

(사업비 부담 예시)

○ 총 120억 원(주차장 조성 95억 원 + 편익시설 25억 원)

- (교육청) 30억 원(25%) / (인천시) 48억 원(40%) / (마추출구) 42억 원(35%)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	23,000	-	-	1,000	11,000	11,000	-
시비	23,000	-	-	1,000	11,000	11,000	-

1-7-3 (교통행정과)		도심 주차난을 해소하겠습니다.				팀장 신혜자 (4801)
						담당자 신선경 (4806)
사업목표		부설주차장 개방을 통한 도심 주차난 해소				추진율 100%
사업구분	사업주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계			협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	
단기	자체	1,152		○		평생학습과

개요

- 지원대상: 일반건축물 등 부설주차장이 있는 건축물
- 지원내용: 부설주차장 개방할 경우, 주차시설개선비 및 운영비 지원(중복지원 불가)
- 지원기준

구분	일반건축물	학 교
지원조건	5면 이상 개방	10면 이상 개방
지원 금액	시설개선비 (최초개방)	3,000만 원 한도 (750만원+개방면수 x 30만 원)
	시설개선비(재개방)	최대 700만 원
	운영보전금	월 2만 원/1면(최대 60면)
개방기간(의무)	3년(시설개선비)/2년(운영보전금)	3년

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 동인천교회 등 13개소 244면 개방	100%
2023년	• 일반 부설주차장 개방 11개소 1,245면, 학교 부설주차장 개방 1개교 25면	100%
2024년	• 일반 부설주차장 개방 14개소 294면, 학교 부설주차장 개방 1개교 40면	100%
2025년	• 일반 부설주차장 개방 5개소 142면, 공공기관(학교) 부설주차장 개방 2개교 113면	100%
2026년	• 일반 부설주차장 개방 10개소 200면, 학교 부설주차장 개방 1개교 20면	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
주차장 조성	목표	1,080면	200면	220면	220면	220면
	실적	2,103면	244면	1,270면	334면	255면
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%

추진실적

- 2022년: 동인천교회 등 13개소 244면 조성
- 2023년: 롯데백화점(관교동 15) 등 11개소 1,245면 조성
인하대학교사범대학부속중학교 부설주차장 개방 MOU체결(1개교 25면)
→ 주민개방 2024. 7. 1.
※ 공공건축물 경인지방식품의약품안전청 등 3개소 92면
- 2024년: 용현동교회 등 14개소 294면 조성
인천인주초등학교 40면 → 주민개방 2024. 11. 1.
※ 공공건축물 인천대학교 제물포캠퍼스 1개소 94면 개방
- 2025년: 할렐루야빌딩 등 5개소 142면 조성
※ 용정초등학교 1개교 19면 재개방: 2025. 1. 1.
※ 인천대학교 제물포캠퍼스 1개교 94면 재개방: 2025. 7. 1.
* 학교부설주차장 개방사업 대상 확대(대학교 추가/2024. 7.~)[시 교통안전과-5324(2024.5.17.)호] 관련

향후 추진계획

- 일반건축물 부설주차장 개방: 10개소 200면 개방추진
- 공공기관 부설주차장 개방: 인천가정법원 신규 개방,
남인천여중/인천대 제물포캠퍼스 2개교 재개방 추진

문제점 및 대책

- 장기 미출차 차량, 쓰레기 등 주차장 관리의 어려움으로 재개방 기피
- 회원제 유도(2회 이상 위반 시 이용 권리 박탈 등)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,152	100	300	376	220	156	1,152
시비	576	50	150	188	110	78	576
구비	576	50	150	188	110	78	576

2026년 본예산 반영하여 투자계획 변경(300백만 원 → 156백만 원)
(부설주차장 개방지원사업(116백만원), 공공기관 부설주차장 개방 사업(시설비-40백만원))

1-8-1 (공원녹지과)		송의로터리 리모델링을 추진하겠습니다.				팀 장 김현숙 (4493)	임형만 (4491)
사업목표		노후시설 개선 및 교통 시야 확보를 위한 리모델링 사업 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	800	○				

개 요

- 사업명: 송의로터리 분수대 리모델링 사업
- 위치: 미추홀구 송의동 162-14(송의로터리)
- 사업비: 800백만 원 [행안부 특별교부세(현안사업)]
- 사업규모: 송의로터리 녹지 1개소
- 사업기간: 2023. 1.~2024. 6.
- 사업내용: 미추홀구 랜드마크인 송의로터리 분수대 및 녹지대의 재조성

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 2022년도 2차 특별교부세 대상사업(현안) 제출('22. 8. 22.) • 2차 특별교부세 확보(8억 원)('22. 12. 22.)	30%
2023년	• 기본 및 실시설계용역 추진 • 주민설명회 및 용역보고회 개최 • 공사 착공 및 준공(준공 미달성으로 '24년 추진)	80%
2024년	• 공사 준공	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
계획수립 및 예산확보	목표 1건	1건				
	실적 1건	1건				
주민참여 및 홍보 (주민설명회 개최 및 언론보도 건수 등)	목표 5건		5건			
	실적 5건		5건			
공사 준공	목표 1건		1건			
	실적 1건			1건		
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%		

추진실적

- 2023. 2. 9. 기본 및 실시설계용역 착수
 - 2023. 5. 1. 주민선호도 조사 결과보고
 - 2023. 5. 22. 용역보고회 개최
 - 2023. 8. 7. 용역보고회(2차) 개최
 - 2023. 8. 23. 주민설명회 개최
 - 2023. 9. 6. 기본계획안 최종 결정
 - 2023. 12. 13. 기본 및 실시설계용역 완료
 - 2023. 12. 14. 공사 착공
-
- 2024. 6. 26. 공사 준공

관련 사진



투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	800	0	800	0	0	0	800
구비	800	-	800	-	-	-	800

1-9-1 (스마트정책실)	스마트시티를 조성하겠습니다.					팀 장	김현주(5920)
						담당자	홍성관(5919) 김훈겸(5916)
사업목표	주민 공감 스마트시티 조성					추진율	100%
사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	11,618.8		○			

개 요

추진배경

- 원도심과 신도심 격차 해소를 위한 시민체감형 스마트도시 사업 추진
- 주민 참여 및 관·학 협력 활성화에 따라 기존에 해결 불가능한 지역문제를 과학기술 및 주민 참여로 해소하고자 하는 지역 주민들의 요구 증가

참여대상: 민(주민), 관(행정), 산(기업), 학(대학)

사업기간: 2022년~2026년 지속 추진

주요분야: 교통, 안전, 환경, 복지 등 전 분야

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	<ul style="list-style-type: none"> • 인천시 스마트도시 리빙랩 공모 사업(환경, 복지분야) 선정 및 추진 완료 • 인천시 스마트기술 실증 공모 사업(환경, 복지분야) 선정 • 지방자치단체 협업특고세 지원(환경분야) 선정 	100%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 인천시 스마트 기술 실증 공모 사업(환경, 복지) 분야 추진 완료 • 2023년 스마트빌리지 공모사업 선정 및 추진(과기부, 인천시) 완료 	100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> • 2024년 스마트빌리지 공모사업 추진(과기부) • 2024년 원도심 스마트빌리지 공모사업 추진(인천시) • 2024년 원도심 스마트빌리지 리빙랩 공모사업 추진(인천시) 완료 	100%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> • 2024년 스마트빌리지 공모사업 추진(과기부) 완료 • 2024년 원도심 스마트빌리지 공모사업 추진(인천시) 완료 • 2025년 스마트빌리지 공모사업 추진(과기부) 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> • 2026년 스마트빌리지 공모사업 선정(과기부) 	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
스마트시티 공모사업 선정 및 추진	목표	7건	2건	2건	1건	1건	1건	
	실적	11건	3건	4건	3건	1건	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

※ 2022년 실적 착오 기재로 정정

추진실적

구분	내용	예산(백만 원)
2022	행정안전부 과학기술 정보통신부 과학기술활용 주민공간 지역문제 해결사업('21. 6.~'22. 7.) - 사업명: 유희공간(빈집·상가·벽면) 활용 수직 스마트팜 설계	200 (국100/구100)
	인천시 스마트도시 리빙랩 공모 사업('22. 5.~9.) - 환경분야: 시민참여 환경 플랫폼 및 환경 My-data 설계	30(시비)
2023	스마트도시 리빙랩 공모 사업('22. 5.~9.) - 복지분야: 스마트 어르신 놀이터 조성 및 건강 My-data 설계	30(시비)
	행정안전부 지방자치단체 협업특교세 지원사업('22. 10.~'23. 6.) - 과제명: 환경 플랫폼 및 환경 My Data 구축	338 (국298/구40)
2023	인천시 스마트기술 실증 공모 사업('22. 11.~'23. 6.) - 환경분야: 환경 플랫폼 및 환경 My-data 구축 (지방자치단체 협업특교세 지원사업과 연계) 에코서를 앱 개발, 스마트 페트병 무인수거기 펫봇 개발	300(시비)
	스마트기술 실증 공모 사업('22. 11.~'23. 11.) - 복지분야: 어르신 놀이터와 건강 My-Data 구축(승학체육공원)	110(시비)
과학기술 정보통신부 인천시	스마트 빌리지 솔루션 보급 및 확산 사업('23. 7.~'24. 6.) - 과제명: 사회적 약자의 안전을 위한 스마트 도화 빌리지 조성 - 장 소: 도화1동 일원(수봉공원, 도화초교, 제일시장) - 내 용: 스마트 솔루션을 조성하여 원도심 지역의 도시인프라 개선 ① 데이터 통합플랫폼(통합 운영 관리 시스템) 구축, ② 스마트 그늘막, ③ 스마트 도서관, ④ 화재알림 iot, ⑤ 취약가구 홀 iot, ⑥ 스마트 미세먼지 알림, ⑦ 스마트폴 및 스마트공원, ⑧ 스마트 안전교차로, ⑨ 스마트 버스정류장 설치	3,500 (국2,800/시350/구350)
2024	과학기술 정보통신부 스마트 빌리지 솔루션 보급 및 확산 사업('24. 1.~'25. 4.) - 사업명: 지속 가능한 친환경 스마트 빌리지 조성 - 장 소: 수봉공원, 미추홀공원, 석바위공원 / 관내 21개 동 - 내 용: ① 스마트 퍼걸러, ② 스마트 체력단련시설, ③ 스마트 그늘막, ④ 스마트 온열 벤치, ⑤ 통합 운영 관리 시스템 고도화	1,990 (국1,393/시298.5/구298.5)

구분	내용	예산(백만 원)
2024	인천시 원도심 스마트 빌리지 리빙랩 공모사업('24. 9.~12.) - 과제명: AI 기반 안전한 도로환경 구축 리빙랩 - 내 용: 민·관·산·학의 협력을 통해 AI, 스마트기술을 활용하여 포트홀, 낙하물 등의 위험물로부터 안전한 도로 환경을 조성하기 위한 창의적 아이디어 구상 및 스마트기술 테스트	35 (국24.5/시5.25/구5.25)
	원도심 스마트 빌리지 군·구 공모사업('24. 1.~'25. 12.) - 과제명: 화재 Zero, 「미추홀구 스마트 안전 건통시장」 조성 - 장 소: 관내 건통시장 7개소 및 골목형 상점가 3개소 - 내 용: ① 스마트 배전반(전기화재 감지)을 통한 화재 사전 예방 시스템 구축, ② 화재 알림 IoT 솔루션을 활용한 신속한 화재 초동대처 체계 수립	1,960 (국1,372/시294/구294)
2025	과학기술 정보통신부 스마트 빌리지 솔루션 보급 및 확산 사업('25. 1.~12.) - 과제명: 스마트 지역아동센터 및 노인여가복지시설 조성 - 장 소: 지역아동센터 14개소, 노인문화센터 2개소, 노인복지관 2개소, 경로당 26개 - 내 용: ① 다양한 스마트 기기를 활용한 여가·복지 인프라 조성, ② 스마트 교육기기를 활용에 취약계층 아동 교육 지원	1,545.8 (국1,082/시231.9/구231.9)
2026	과학기술 정보통신부 스마트 빌리지 솔루션 보급 및 확산 사업('26. 1.~12.) - 과제명: AI 및 ICT를 활용한 건강증진 인프라 조성 - 장 소: 미추홀구 국민체육센터, 주안스포츠포지움센터, 미추홀구 건강체력증진센터, 송의보건지소 - 내 용: ① 수영장 익수사고 예방 AI 안전관리 시스템 구축 ② AI 맞춤형 운동을 통한 주민 건강·체력 증진 인프라 조성 ③ AI 재활 운동기기를 통한 노인·장애인 건강·체력 회복 인프라 조성	1,580 (국1,106/시237/구237)

향후 추진계획

☐ 2026년 공모사업 추진

- 과기부 스마트 빌리지 보급 및 확산 사업 : 2026. 1월~12월 (AI 및 ICT를 활용한 건강 증진 인프라 조성)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	11,618.8	260	4,248	3,985	1,545.8	1,580	-	11,618.8
국비	8,175.5	100	3,098	2,789.5	1,082.0	1,106	-	8,175.5
시비	1,886.65	60	760	597.75	231.9	237	-	1,886.65
구비	1,556.65	100	390	597.75	231.9	237	-	1,556.65

1-10-1 (도시재생과)		재개발·재건축 신속 추진 및 주민 추가부담금 경감을 추진하겠습니다.				팀 장 신동희 (7946)	
						담당자 안현진 (7947)	
사업목표		주안2·4동 재정비촉진사업 신속 추진				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비예산	○				인천광역시 도시균형정책과

개 요

□ 필요성

- 존치관리구역 내 재개발사업을 원하는 주민의 지속적인 요구사항이 있어, 관계 법령 및 주민의 요구사항 등을 종합적으로 검토하여 합리적인 촉진계획 수립 필요
[총 5개소: 미추2,4,5,6,7존치관리구역]

□ 촉진계획 검토내용

- 촉진구역에 재지정 요건 및 기반시설(도로, 공원 등) 적정성 검토
- 재정비촉진지구·계획 변경(안) 검토 등

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 촉진구역 재지정 관련 인천시 협의 진행(주민제안 등)	20%
2023년	• 촉진계획(변경) 주민제안 신청(주민 → 구) • 촉진계획(변경) 결정(안) 검토(기초조사 및 사전 협의) • 행정절차 이행(사업협의회 개최, 도시재정비위원회 자문 등)	50%
2024년	• 행정절차 이행(공람, 구 의회 의견 청취, 주민공청회 등) • 촉진계획(변경) 결정(안) 입안(구 → 시) • 관련 부서 협의 및 각종 심의(시)	70%
2025년	• 촉진계획 변경 고시(시)	100%

공약달성 확인지표


확인지표	목표 및 실적	연도별			
		2022	2023	2024	2025
촉진구역 재지정 관련 인천시 협의 진행	목표 1건	1건			
	실적 1건	1건			
촉진계획(변경) 결정(안) 검토(사업협의회 개최 등)	목표 1건		1건		
	실적 1건		1건		
행정절차 이행(주민설명회, 공람, 구 의회 의견 청취, 공청회 등)	목표 4건			4건	
	실적 4건			4건	
촉진계획(변경) 결정 신청	목표 1건			1건	
	실적 1건			1건	
촉진계획 변경 고시	목표 1건				1건
	실적 1건				1건
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%

추진실적

- 2022. 3.~8. : 촉진구역 재지정 관련 인천시 협의 진행(주민제안방식 등)
- 2023. 5. : 재정비촉진지구·계획(변경) 주민제안 서류 접수
- 미추4,5,6,7존치관리구역 → 촉진구역 지정
- 2023. 8. : 재정비촉진지구·계획(변경) 주민제안 요건 검토 완료
- 토지 등 소유자 2/3 이상, 토지 면적 1/2 이상, 노후도 2/3 이상, 호수밀도 50호/ha 이상 등의
- 2023. 8.~12. : 관련 부서 협의 및 의견에 대한 조치계획 작성
- 2024. 1. : 2024년 제1회 사업협의회 개최
- 2024. 3. : 추정부담금 검증위원회 개최
- 2024. 4. : 주안2·4동 일원 재정비촉진지구·계획 변경(안) 주민공람 시행
- 2024. 6. : 제1회 인천광역시 도시재정비위원회 자문 개최
- 용도지역 변경 관련 자문(원안 가결)
- 2024. 6. : 주안2·4동 일원 재정비촉진지구·계획 변경(안) 주민 재공람 시행
(재공람 기간: 2024. 6. 17.~7. 3.)
- 2024. 7. : 주안2·4동 일원 재정비촉진지구·계획 변경(안) 구 의회 의견 청취
- 2024. 8. : 주안2·4동 일원 재정비촉진지구·계획 변경(안) 공청회 개최
- 2024. 9. : 주안2·4동 일원 재정비촉진지구·계획 변경(안) 결정 신청(→시)
- 2024.10. : 관련 부서(기관) 협의
- 2025. 3. : 경관위원회 심의
- 2025. 6. : 교육환경보호위원회 심의
- 2025. 7. : 시 도시재정비위원회 심의(결과: 보류) → 기반시설 비용분담계획, 경관계획 등 보완
- 2025. 11. : 시 도시재정비위원회 재심의(결과: 수정 수용)
- 2025. 12. : 주안2·4동 일원 재정비촉진지구 지정(변경) 및 재정비촉진계획(변경) 결정 고시(市)

투자계획

비에산

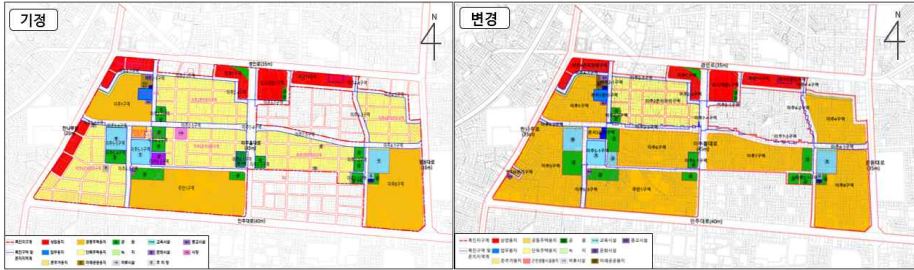

1-10-2 (도시정비과)		재개발·재건축 신속 추진 및 주민 추가부담금 경감을 추진하겠습니다.			팀 장 소경섭(4751) 전진희(4756)		
사업목표		도시정비사업(재개발·재건축) 관련 신속절차제도 추진을 위한 체계 구축 및 주민 추가부담금 경감			담당자 이덕원(4752) 전성주(4757)		
					추진율 100%		
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비에산		○			도시재생과

개 요

- 사업목표**
 - 재개발·재건축의 신속한 추진을 위하여 사업 지연 요소를 분석·개선하여 정비사업을 신속하게 추진하고 불필요한 사업비를 절감하여 주민의 부담금을 경감시키고자 함
 - 구청 내 정비사업 '신속추진 TF' 구성 및 운영, 법령 등 개선사항 발굴
- 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업: 25개소(2025. 12월 기준)
 - 재개발·재건축 16개소, 주거환경개선사업 1개소, 재개발 후보지 8개소
- 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모주택정비사업: 31개소

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	<ul style="list-style-type: none"> • 재개발·재건축 신속추진 계획 수립 • 신속추진 TF 구성 및 운영, 제도 개선사례 발굴 	50%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 신속추진 TF 추진, 제도 개선사례 발굴 (분기별 회의 개최) 	100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> • 신속추진 TF 추진, 제도 개선사례 발굴 (분기별 회의 개최) 	100%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> • 신속추진 TF 추진, 제도 개선사례 발굴 (분기별 회의 개최) 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> • 신속추진 TF 추진, 제도 개선사례 발굴 (분기별 회의 개최) 	100%

공약 조정 내역

- 2022년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2022. 9. 15.
 - 조정내역: 세부 과제명 변경
(도시정비사업 관련 신속절차제도 도입 및 주민 추가부담금 경감
→ 도시정비사업 관련 신속절차제도 추진을 위한 체계 구축 및 주민 추가부담금 경감)
 - 조정사유: 원도심인 미추홀구의 신속한 도시정비사업 추진을 위해 구민들이 체감할 수 있도록 체계를 먼저 구축한 후 법령 개정은 장기적으로 추진하고자 변경함

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
신속 추진 TF 운영	목표	18회	2회	4회	4회	4회	4회	
	실적	14회	2회	4회	4회	4회	-	
제도 개선사례 발굴	목표	23건	7건	4건	4건	4건	4건	
	실적	19건	7건	4건	4건	4건	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2023년 신속추진 TF 운영: 4회
 - 법령정비 개선사례 발굴
 - 2023년 2차 재개발사업 사전검토 제안서 공모 추진계획
 - 정비사업 추진 시 관련 절차 누락 방지를 위한 방안 검토 등
- 2023년 제도 개선사례 발굴: 4건
 - 소규모주택 정비사업 조합설립 변경인가 시 주민공람 절차 개선
 - 정비사업 일부 완공된 건물에 대한 준공인가의 명문화
 - 소규모주택 정비사업 통합심의 의무사항 완화
 - 재건축 안전진단 요청서 신청인 기재내용 변경
- 2024년 신속추진 TF 운영: 4회
- 2024년 제도 개선사례 발굴: 4건
- 2025년 신속추진 TF 운영: 4회
 - 조례 제정 검토 및 전문조합관리인 선정 관련 조례 개정 검토
 - 건축행정시스템 개선 관련
- 2025년 제도 개선사례 발굴: 4건
 - 재개발·재건축 정비사업 자문단 설치 관련 조례 제정 검토
 - 전문조합관리인 선정 관련 조례 개정 건의

향후 추진계획

- 재개발·재건축의 신속한 추진을 위하여 사업 지연 요소를 분석·개선하여 구민 요구에 부합하고 속도감 있는 정비사업을 추진하고자 함

투자계획

비에산

1-11-1 (도시재생과)		인천대로와 연계한 주변 개발사업을 적극 추진하겠습니다.				팀 장	김종호 (7471)
						담당자	길경자 (7474)
사업목표		인천대로 연계 주변 재생사업 적극 추진				추진율	60%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	인천시	비예산			○		市 인천대로개발과

개 요

- 위 치: 미추홀구 용현동 667번지 일원
- 사업기간: 2021년~2028년
- 사업규모: 대지면적 6,772.4㎡, 연면적 76,886㎡
- 사업내용: 문화·생활체육 시설, 근린생활·업무 시설
- 개발방법: 시 부지매각 제안공모를 통한 민간사업자 선정

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	<ul style="list-style-type: none"> · '2040 인천도시기본계획' 공고(주거지역→상업지역) · 인천시·인하대 간 토지교환 승인(교육부) · 토지이동(분할), 토지교환 관련 소유권 이전 완료 	20%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> · 도시관리계획 결정(변경) 고시 	40%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> · 공공운영 관련 관리기관 협의 	60%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업성 분석 및 매각계획 수립 	80%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> · 민간사업자 선정(매각낙찰자 선정, 매매계약 체결) 	100%

공약 조정 내역

- 2025년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 3. 10.
 - 조정내역: 추진계획, 확인지표, 투자계획 변경
 - 조정사유: 건설 및 부동산 경기 악화, 복합문화시설 사업성 변동에 따른 사업성 검토 및 매각 시기 조정 등에 따라 인천시의 인하대 주변 거점개발 추진계획 변경됨

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
토지교환 및 소유권 이전	목표 1건	1건					
	실적 1건	1건					
도시관리계획 결정(변경) 고시	목표 1건		1건				
	실적 1건		1건				
공공운영 관련 관리기관 협의	목표 1건			1건			
	실적 1건			1건			
사업성 분석 및 매각계획 수립	목표 2건			1건	1건		
	실적 2건			1건	1건		
매각낙찰자 선정(매매계약 체결)	목표 1건					1건	
	실적 -					-	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2021년 인천대로 주변 거점개발 사업화방안 수립
- 2022년 인천시·인하대 간 토지교환 승인(교육부)
도시관리계획 변경(안) 입안, 토지교환 관련 소유권 이전 완료
- 2023년 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
기부채납시설 운영기관 협의(~2024. 7월)
- 2024년 인하대 주변 거점개발 추진계획 수립, 사업성 분석 기초조사 실시
- 2025년 복합문화센터 내 기부채납시설 제외에 따른 사업성 검토
연계개발 합의를 위한 양해각서 체결(인천광역시-인하대)

향후 추진계획

- 2026. 1월 : 개발 방향·계획 타당성조사 용역 착수(인하대)
- 2026. 하반기: 연계개발을 위한 실시협약 체결

투자계획

비예산

1-11-2 (도시정비과)		인천대로와 연계한 주변 개발사업을 적극 추진하겠습니다.				팀 장 소경섭(4751) 전진희(4756)	
사업목표		용현4구역, 도화1구역 주택 재개발사업 적극 추진				담당자 오정민(4753) 서민아(4758)	
		추진율				100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비에산		○			

개 요

- 사업목적:** 분기별 조합 점검 및 총회 참석 등을 통해 주민 소통을 강화하여 정비사업의 활성화를 도모하고자 함
- 용현4구역**
 - 사업위치: 용현동 152-8번지 일원(구역면적: 47,951㎡)
 - 추진현황: 정비계획 수립 및 정비구역 지정(변경) 고시(2022. 11. 28.), 사업시행계획인가 접수(2025. 5. 9.)
- 도화1구역**
 - 사업위치: 도화동 372-18번지 일원(구역면적: 81,788.8㎡)
 - 추진현황: 이주 완료(2022. 9. 29.~2025. 1. 21. / 이주율: 100%)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 2/4, 3/4, 4/4분기 조합 점검 • 구역별 조합 총회 연 1회 이상 참석(정기총회: 연 1회, 임시총회: 비정기 개최)	100%
2023년	• 분기별 조합 점검(연 4회) • 구역별 조합 총회 연 1회 이상 참석(정기총회: 연 1회, 임시총회: 비정기 개최)	100%
2024년	• 분기별 조합 점검(연 4회) • 구역별 조합 총회 연 1회 이상 참석(정기총회: 연 1회, 임시총회: 비정기 개최)	100%
2025년	• 분기별 조합 점검(연 4회) • 구역별 조합 총회 연 1회 이상 참석(정기총회: 연 1회, 임시총회: 비정기 개최)	100%
2026년	• 분기별 조합 점검(연 4회) • 구역별 조합 총회 연 1회 이상 참석(정기총회: 연 1회, 임시총회: 비정기 개최)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					입기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
분기별 조합 점검	목표 40회	8회	8회	8회	8회	8회	
	실적 32회	8회	8회	8회	8회	-	
조합 총회 참석	목표 10회	2회	2회	2회	2회	2회	
	실적 7회	2회	1회	2회	2회	-	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 용현4구역
 - 2023년 4월 조합 총회 참석
 - 2024년 4월 조합 총회 참석
 - 2025년 1~4분기 조합점검 완료, 1분기 총회 참석
- 도화1구역
 - 2023년 조합 총회 미개최
 - 2024년 4월 조합 총회 참석
 - 2025년 1~4분기 조합점검 완료, 8월 주민총회 참석

향후 추진계획

- 조합점검·주민소통을 통한 정비사업 추진과정의 애로사항 청취하여 정비사업 활성화 도모

투자계획

비에산

1-12-1 (도시재생과)		제물포 북측구역 도시재생사업을 추진하겠습니다.				팀 장	이정화 (5963)
사업목표		제물포 Station-J 뉴딜사업 추진				담당자	송진수 (5964)
추진율		80%					
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	인천시	79,226			○		市 도시균형정책과

개 요

- 위 치:** 제물포역 일원(도화동, 송의동 일부)
- 면 적:** 146,000㎡
- 사업기간:** 2022년~2028년
- 사업유형:** 중심시가지형(중앙선정)
- 시 행 자:** 인천광역시, 인천도시공사(IH)
- 주요사업**
 - 영스퀘어 활성화 : 영스퀘어 플랫폼 조성
 - 가로 활성화 : 가로경관개선, 제물포담소 조성 등
 - 스마트 Station-J : 스마트 마을플랫폼, 스마트 기반시설 등
 - 정주환경개선 및 주민역량강화 : 집수리 지원, 주민공모사업 등

새로운 100년의 미래를 여는 **제물포 Station-J**



연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 제물포역 일원 도시재생활성화계획 고시 알림(市→公社) • 제물포 Station-J 대행업무 위·수탁 계약 체결(市→公社)	20%
2023년	• 영스퀘어 플랫폼 및 제물포담소 기본 및 실시설계 • 각종 S/W 사업 운영 및 모니터링 • 담소·분식거리 경관개선사업 실시설계용역 • 집수리 지원사업, 주민공모사업 • 스마트 Station-J 구축사업 스마트도시건설사업 실시계획 수립	40%
2024년	• 영스퀘어 플랫폼 도시계획위원회 개최, 도시재생활성화계획 변경 • 제물포담소 도시재생활성화계획 변경, 철거공사, 실시설계 • 담소·분식거리 및 주민공원 경관개선, 제물포경로당 리모델링 준공 • 스마트 Station-J 스마트플랫폼 구축 및 스마트헬터 설치 • 각종 S/W 사업 운영 및 모니터링, 집수리 지원사업, 주민공모사업	60%
2025년	• 제물포담소 및 영스퀘어 플랫폼 착공 • 집수리 지원사업, 주민공모사업, 각종 S/W 사업 운영 및 모니터링	80%
2026년	• 제물포담소 및 영스퀘어 플랫폼 준공 • 집수리 지원사업, 주민공모사업, 각종 S/W 사업 운영 및 모니터링	100%
임기 후	• 각종 S/W 사업 운영 및 모니터링 • 사업완료	100%

공약 조정 내역

- 2025년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 3. 10.**
 - 조정내역: 추진계획, 확인지표, 투자계획 변경
 - 조정사유: 제물포역 일원 도시재생활성화계획(중대한 변경) 고시에 따라 추진계획 등 변경

공약달성 확인지표

확인지표	실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
위·수탁 계약 체결	목표	2건	2건				
	실적	2건	2건				
영스퀘어 플랫폼 조성	목표	조성	설계	설계	착공	준공	
	실적	설계	착수	설계	착공	-	
가로 활성화	목표	준공	설계	경관개선	담소 착공	담소 준공	
	실적	착공	착수	담소·분식거리, 주민공원 개선	담소 착공	-	
스마트 station-j	목표	조성	계획 수립	정주환경 조성, 플랫폼 구축	정주환경 조성		
	실적	조성	계획 수립	스마트플랫폼, 스마트헬터 등	시니어프로그램		
정주환경 개선	목표	4회	집수리지원	집수리지원	집수리지원	집수리지원	
	실적	3회	완료(10월)	완료(12월)	주민공모사업	-	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

○ 제물포 Station-J 도시재생 뉴딜사업 선정	: 2021.12월
○ 2022년 도시재생위원회 심의 완료	: 2022. 2월
○ 제물포역 일원 도시재생활성화계획 고시	: 2022. 3월
○ 총괄사업관리자(IH) 대행업무 위·수탁 계약 체결	: 2022. 4월
○ 스마트 도시재생 대행사업 위·수탁 계약 체결	: 2022. 7월
○ 집수리 지원사업 모집 공고	: 2023. 3월~4월
○ 담소거리 및 주인공원 경관개선사업 재배정(미추홀구)	: 2023. 3월
○ 영스퀘어 및 제물포담소 건립 설계용역 착수	: 2023. 4월
○ 상반기 주민공모사업 완료(2건, 17백만 원)	: 2023. 7월
○ 도시재생활성화계획 경미한 변경 고시	: 2023.10월
○ 집수리 지원사업 완료	: 2023.10월
○ 스마트 Station-J 구축사업 스마트도시건설사업 실시계획 수립	: 2023.10월
○ 담소·분식거리 경관개선사업 실시설계용역 착수	: 2023.11월
○ 도시계획시설 변경을 위한 도시계획위원회 개최	: 2024. 1월
○ 주민공모사업 및 집수리 지원사업 모집공고	: 2024. 3월~4월
○ 담소·분식거리 경관개선사업 실시설계용역 주민설명회 개최	: 2024. 3월
○ 스마트 Station-J 스마트 횡단보도 설치 및 인수인계 완료	: 2024. 3월
○ 주인공원 환경개선공사 시행	: 2024. 3월~7월
○ 도시재생활성화계획 변경(경미한) 고시(2차)	: 2024. 4월
○ 담소·분식거리 경관개선사업 실시설계용역 완료	: 2024. 4월
○ 제물포역 일원 도시재생활성화계획 변경을 위한 공청회 개최	: 2024. 7월
○ 제물포경로당 리모델링 공사 시행	: 2024. 5월~7월
○ 담소·분식거리 경관개선사업(토목, 전기, 통신) 시행	: 2024. 8월~12월
○ 제물포담소 철거 공사 시행	: 2024. 9월~12월
○ 주인공원 환경개선공사(2단계) 시행	: 2024.10월~12월
○ 스마트 Station-J 스마트플랫폼 구축 및 스마트쉼터 설치 완료	: 2024.12월
○ 주민공모사업 및 집수리 지원사업 완료	: 2024.12월
○ 도시재생활성화계획 변경(중대한) 결정	: 2024.12월
○ 지하안전영향평가서 제출(시→구 건축과)	: 2025. 5월
○ 스마트 Station-J-시니어프로그램 추진	: 2025. 5월
○ 집수리 지원사업(14호) 및 주민공모사업(6개) 선정	: 2025. 6월
○ 영스퀘어 굴착허가 신고	: 2025. 6월
○ 제물포담소 일상감사 및 계약심사, BF예비인증 완료	: 2025. 6월
○ 제물포담소 건설사업 공사발주 시행	: 2025. 7월
○ 영스퀘어 건축허가 완료	: 2025. 8월
○ 제물포담소 건설사업 재해예방기술지도 용역 계약	: 2025. 8월
○ 영스퀘어 설계VE 심사 완료	: 2025. 9월
○ 제물포담소 건설사업 착공	: 2025. 9월
○ 영스퀘어 건설기술심의 완료	: 2025.10월
○ 영스퀘어 일상감사 완료, 스마트 경로당 구축사업 완료	: 2025.11월
○ 영스퀘어 건축공사 착공	: 2025.12월

향후 추진계획

- 제물포담소, 영스퀘어 플랫폼 건축 공사 추진
- 집수리 지원 등 정주환경개선 및 주민역량강화 사업

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	입기 후	
계	79,226	3,460	5,002	5,307	10,349	10,500	44,608	34,618
국비	18,000	1,600	1,933	1,993	2,315	7,570	2,589	15,411
시비	40,140	1,860	3,069	3,314	8,034	2,930	20,933	19,207
기타	21,086	-	-	-	-	-	21,086	-

※ 2028년으로 연장된 사업 기간에 맞춰서 예산 확보

※ 연도별 투자계획 전체 수정: 당초 착오 기재

1-12-2 (도시정비과)		제물포 북측구역 도시재생사업을 추진하겠습니다.			팀 장	전진희 (4756)	
					담당자	전성주 (4757)	
사업목표		공공주택 3080+ 도심공공주택 복합사업 추진			추진율	30%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	인천시	비예산			○		市 도시균형정책과

개 요

- 사업 명 : 인천 마추홀구 제물포역 북측 도심 공공주택 복합사업
- 위 치 : 도화동 94-1번지 일원
- 사업면적 : 99,260.9㎡ (공동주택 3,535세대 공급)
- 시 행 자 : 인천도시공사

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 각종 용역 및 영향평가 시행	5%
2023년	• 민간사업자 공모, 민간사업자 우선협약대상자 선정	15%
2024년	• 복합사업계획 승인	30%
2025년	• 철거 및 공사 착공	50%
2026년	• 공사 시행	60%
임기 후	• 공사 준공 및 입주	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
각종 용역 및 영향평가 발주	목표 3건	3건					
	실적 3건	3건					
시공사 선정	목표 1건		1건				
	실적 1건		1건				
복합사업계획 승인	목표 1건			1건			
	실적 1건			1건			
공사 착공	목표 1건				1건		
	실적 보상협의				보상협의		
공사 시행(공정률)	목표 30%					30%	
	실적 -					-	
공사 준공	목표 1건						1건
	실적 -						-
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	0%	%	%

추진실적

- 2022. 2. 복합지구 지정 고시
- 2022. 7. 각종 용역(조사설계, 재해영향평가 등) 발주
- 2023. 11. 민간사업자 우선협상자 선정(DL E&C + 현대건설)
- 2023. 12. 사업협약 체결(iH↔민간사업자)
- 2024. 3. 복합사업계획승인 신청
- 2024. 7. 공공주택 복합사업계획 승인 관련 협의
- 2024. 8. 감정평가법인 계약 체결 및 감정평가 준비
 - ※ 인천시청: 대한감정평가법인, 도시공사: 태평양감정평가법인, 구역주민: 중앙감정평가법인
- 2024. 9. 제물포역 북측 도심 공공주택 복합사업계획 승인 신청에 대한 주민 등의 의견 청취 공고
- 2024. 11. 복합사업계획 승인을 위한 통합심의 시행
- 2024. 12. 복합사업계획 승인(인천광역시 고시 제2024-407호)
- 2025. 2. 감정평가 완료 및 보상 협의 진행 중
- 2025. 6. 복합사업 복합지구 지정(변경) 승인
- 2025. 9. 보상협의회 구성 및 위원 위촉
- 2025. 11. 보상협의회 개최 및 중앙토지수용위원회 수용재결 열람 공고
- 2025. 12. 제1회 보상협의회 안건 검토의견 안내

향후 추진계획

- 2026년 상반기 : 일부 철거공사 착공
- 2031년 : 공사 준공

협조부서 연계사항

- 인.허가권자 : 인천광역시(도시균형정책과)
- 사업시행자 : 인천도시공사

투자계획

비예산

1-13-2 (건설과)		도화지구 도시재생사업을 추진하겠습니다.				팀 장 최문기 (4991)	담당자 박윤정 (4993)
사업목표		도심 전선 지중화사업 확대				추진율	72.5%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	자체	2,339.9			○		

개 요

- 사업위치: 숙골로88번길 12~장고개로 31(도화사거리~인천비즈니스고교 후문)
- 사업규모: 연장 L=450m, 한전주 15본 철거
- 사업기간: 2025. 1.~2027. 5.
- 총사업비: 2,339.9백만 원(국비 468, 지방비 820.2, 사업자 1,051.7)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 사업대상지 사업 타당성 검토	5%
2023년	• 지중화사업 신청 안내(한전→구) • 지중화사업 신청(구→한전) • 선정결과와 통보(한전→구): 미선정	7.5%
2024년	• 지중화사업 신청 안내(한전→구) • 지중화사업 신청(구→한전)	10%
2025년	• 선정결과와 통보(한전→ 구) • 지상기기 위치 협의(한전, 구) • 협약서 체결(한전)	50%
2026년	• 공사 설계 및 사업비 지출 • 공사 착공	100%
임기 후	• 공사 준공	100%

공약 조정 내역

- 2024년 2차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2024. 11. 19.
 - 조정내역: 사업계획, 추진계획, 확인지표 등 변경
 - 조정사유: 한국전력공사의 재정 여건 악화 등으로 선정 개소 수 축소됨
2025년 선정 가능성 제고 및 구 재정 고려하여 사업 규모, 추진계획 등 수정

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
사업대상지 사업 타당성 검토	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
사업 신청 및 선정	목표	선정		선정	신청	선정		
	실적	선정		미선정	신청	선정		
협약체결 및 사업비 지출	목표	2건				협약체결	사업비 지출	
	실적	1건				협약체결 선금 지출	-	
공사 착공 및 준공	목표	2건					착공	준공
	실적	-					-	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	50%	%

추진실적

- 2023. 7. 지중화사업 신청(구 → 한전)
- 2024. 2. 지중화사업 미선정 통보(한전 → 구)
- 2024. 7. 지중화사업 신청(구 → 한전)
 - 「2025년 전선 지중화사업 계획」(2024. 7. 12.)에 따라 사업 규모 축소
(연장 L=1,070m → 450m, 한전주 38본 → 15본)
- 2024. 11. 2025년 전선로 지중화 사업 선정 통보(시 → 구)
- 2025. 12. 지중화사업 예산확보(2025년 본예산 국/시/구비)
- 2025. 3. 지중화사업 선정 결과 통보(한전 → 구)
- 2025. 4. 지상기기 위치협의(한전, 구)
- 2025. 5. 인천비즈니스고교 이행 협약체결(한전)
 - 구 지방재정 투자심사 완료
 - 지자체 부담금 선금(720백만 원) 지출
- 2025. 7. 실시설계 착수(한전)

향후 추진계획

- 2026. 2월 지자체 부담금 지출(568.2백만 원 범위 내)
- 2026. 6월 공사 착공
- 2027. 5월 공사 준공

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	2,339.9	-	-	-	1,771.7	568.2	-	2,339.9
국비	468	-	-	-	288	180	-	468
시비	410.1	-	-	-	216	194.1	-	410.1
구비	410.1	-	-	-	216	194.1	-	410.1
기타	1,051.7	-	-	-	1,051.7	-	-	1,051.7

※ 2025년 전선로 지중화 사업지원 국비 계획 확정 통보(시→구)에 따라 사업비 변경

1-13-3 (주택관리과)		도화지구 도시재생사업을 추진하겠습니다.				팀 장 한영희 (4556)	
						담당자 강대원 (4558)	
사업목표		분양전환 대비 적정 분양가를 위한 민관협의체 구성				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비예산	○				

개 요

□ 사업내용

- 도화지구 내 임대주택 분양전환 가격 결정 관련 분양전환 시 감정평가 기준시점 등이 법적 분쟁으로 야기됨에 따라 분쟁을 사전에 방지하기 위한 임대주택분쟁조정위원회 기능 강화(감정평가사 1인 추가 위촉)

□ 도화지구 내 임대주택 현황

구분	공동주택명			
	도화서히스타힐스	e편한세상 도화5단지	e편한세상 도화6-1단지	e편한세상 도화6-2단지
임대종류	민간임대	민간임대	민간임대	공공임대
사용검사일	2016.10.27	2018.01.25	2018.01.25	2018.01.25
임대개시일	2016.11.01	2018.02.22	2018.02.22	2018.02.22
분양전환 가능시기	2024.11.01~	2028.02.22~	2028.02.22~	2028.02.22~

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 임대주택분쟁조정위원회 위원 (재)위촉 계획 수립	20%
2023년	• 임대주택분쟁조정위원회 위원(감정평가사) 1인 추가 위촉 • 현안 발생 시 임대주택분쟁조정위원회 개최 및 분쟁 조정	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
임대주택분쟁조정위원회 (재)위촉 계획 수립	목표	1건		1건			
	실적	1건		1건			
임대주택분쟁조정위원회 구성 현황 (감정평가사 1인 추가 위촉)	목표	1건			1건		
	실적	1건			1건		
당해 연도 목표 달성률				100%	100%		

추진실적

- 2022. 12월: 도화지구 내 분양전환 대상 공동주택 현황 조사
- 2023. 12월: 임대주택분쟁조정위원회 위원 (재)위촉 계획 수립
- 2024. 3월: 임대주택분쟁조정위원회 위원 추천 의뢰 및 연임 의견 조희
- 2024. 4월: 임대주택분쟁조정위원회 (재)구성

향후 추진계획

- 임대주택분쟁조정위원회 운영(상시)

투자계획

비예산

1-14-1 (경제지원과)	노후 산업단지 구조고도화 및 환경개선사업을 지원하겠습니다.					팀 장	신영석 (4671)
						담당자	한영규 (4673)
사업목표		노후 산업단지 구조고도화 및 환경개선사업 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	19		○			

개 요

- 인천기계산업단지 배치도 설치
 - 설치기간: 2022. 7월 중
 - 위 치: 인천광역시 미추홀구 장고개로 98 외 1개소
 - 내 용: 인천기계산업단지 배치도 2개소 설치
 - 사 업 비: 19백만 원(전액 구비)
- 주안산단역 지식산업센터 J원 플렉스 건립
 - 사업주체: (주)한승드림타워
 - 위 치: 인천광역시 미추홀구 주안동 3-26
 - 건축규모: 31,091㎡ (10층/지하2층)
 - 총사업비: 470억 원(국비 100억 원 / 민간 370억 원)
- 산업단지 재생 활성화 용역 반영 요청
 - 수신처: 인천광역시 산업입지과
 - 주안국가산업단지(미추홀구) 주차장 부족 해소: 이면도로 노상주차장 도입
 - 인천기계산업단지 주차장 부족 해소: 성보공업 부지에 지상 또는 지하 주차장 건립
 - 인천기계산업단지 재생: 노후 담장 및 석면·슬레이트 지붕 개선 지원 사업
 - 요청일자: 2023. 6월
- 환경개선사업 지속 추진 및 발굴
 - 산업단지 환경 개선 필요한 사항 발굴하여 추진
 - 대상 산업단지: 주안국가산업단지, 인천기계산업단지, 인천지방산업단지

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 인천기계산업단지 배치도 설치 - 2개소 완료 • 지식산업센터 J원 플렉스 - 1개소 준공 및 입주	100%
2023년	• 환경개선사업 지속 추진 및 발굴	100%
2024년	• 환경개선사업 지속 추진 및 발굴	100%
2025년	• 환경개선사업 지속 추진 및 발굴	100%
2026년	• 환경개선사업 지속 추진 및 발굴	100%

공약달성 확인지표

확인지표	실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
인천기계산업단지 배치도 설치	목표	2개소					
	실적	2개소					
주안산단역 지식산업센터 건립 (J원 플렉스)	목표	1개소					
	실적	1개소					
환경개선사업 지속 추진 및 발굴	목표	4건	1건	1건	1건	1건	
	실적	3건	1건	1건	1건	-	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 인천기계산업단지 배치도 설치 : 2022. 7월
- 지식산업센터 J원 플렉스 준공 : 2022. 9월
- 산업단지 재생 용역 반영 요청 : 2023. 6월
- 도화동 979번지 보도환경 개선 : 2024. 9월
- 인천지방·기계산업단지 재생사업지구계획 용역 관련 건의사항 제출 : 2025. 9월

향후 추진계획

- 환경개선사업 지속 추진·발굴 및 주기적 산업단지 순찰로 필요 사업 연계

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	19	19	-	-	-	-	-	19
구비	19	19	-	-	-	-	-	19

1-15-1 (경제지원과)		지방산업단지 고도화 사업을 추진하겠습니다.				팀 장 신영석 (4671)	
						담당자 한영규 (4673)	
사업목표		지방산업단지 고도화 사업 추진				추진율 65%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	인천시	비예산			○		市 산업입지과

개 요

□ 경쟁력강화사업 지구 재생사업

- 사업위치: 인천 지방·기계 산업단지 일원
- 사업면적: 인천지방산단 1,136,000㎡, 인천기계산단 350,000㎡
- 사업기간: 2024. 1.~2028. 12.
- 사업내용: 주차장 및 공원 조성 각 1개소, 도로환경개선(보도 정비 등)

□ 주안 국가산업단지 재생사업

- 사업위치: 부평 및 주안 국가산업단지 일원
- 사업면적: 1,858,735㎡ (부평 609,067㎡, 주안 1,249,668㎡)
- 사업내용
 - 길파로(6단지 구역) 특화 가로조성(메타세콰이어 숲길): 특화 디자인, 조형물 설치
 - 염전로333번길 특화 가로조성(청년문화의 거리): 스마트 버스정류장, 가로등 설치
 - 복합용지 총량제 설정: 산업용지를 복합용지로 변경하여 식당, 카페 등 편의시설 확보

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 인천기계산업단지 도시재생 뉴딜사업 활성화 계획 수립용역 착수 • 주안 국가산업단지 재생사업 용역 시행	30%
2023년	• 인천기계산업단지 도시재생 뉴딜사업 공모 신청 및 추진 • 인천기계산업단지 도시재생활성화계획(안) 제출 • 주안 국가산업단지 재생사업지구계획 수립 및 승인·고시	70%
2024년	• 인천기계산업단지 도시재생 뉴딜사업 승인 고시 • 인천기계산업단지 도시재생 뉴딜사업 추진 • 주안 국가산업단지 재생사업 추진	100%
2025년	• 뉴딜사업 및 재생사업 지속 추진	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
산업단지 용역 진행 건수	목표	2건	2건			
	실적	2건	2건	착수	추진	
인천기계산업단지 - 도시재생활성화계획(안) 제출	목표	제출		제출		
	실적	제출		제출		
주안국가산업단지 - 재생사업지구계획 수립 및 승인·고시	목표	승인		승인·고시		
	실적	수립		수립	심의	협의
산업단지 뉴딜사업 및 재생사업 추진	목표	추진			추진	추진
	실적	-				
당해 연도 목표 달성률		100%	75%	0%	50%	

추진실적

- 경쟁력강화사업 지구 재생사업
 - 인천기계산업단지 도시재생 뉴딜사업 공모 신청 : 2023. 7. 24.
 - 인천기계산업단지 도시재생 활성화계획(안) 제출 : 2023. 3월
 - : 인천도시공사-市 사업 협의 과정에서 사업 내용 중복 등의 문제로 도시재생활성화사업 반려 → 市 경쟁력강화사업 지구 재생사업
 - 재생사업지구계획 수립 용역 착수 : 2024. 10. 28.
 - 인천 지방·기계산업단지 재생사업 지구계획 수립 용역 착수보고회 : 2024. 12. 6.
 - 일반산업단지 관리기관 실무협의회 참석 : 2024. 12. 11.
 - 경쟁력강화사업 환경, 재해, 교통 등 제영향평가 용역 시행 : 2025. 6월~
 - 인천지방·기계산업단지 재생사업지구계획 중간보고회 참석 : 2025. 9. 23.
- 주안국가산업단지 재생사업
 - 주안국가산업단지 재생사업지구계획 수립 : 2023. 10. 16.
 - 지방산업단지계획 심의위원회 통합심의 보고 : 2024. 12. 16.
 - 주안국가산업단지 재생사업 타당성검증(국토연구원), 총사업비 협의 : 2025. 4월~

향후 추진계획

- 경쟁력강화사업 지구 재생사업(인천 지방·기계 산업단지 일원)
 - 산업단지재생계획 및 재생시행계획 승인·고시 : 2026년 하반기
- 주안 국가산업단지 재생사업
 - 재생사업지구계획 승인·고시 : 2026년 상반기
 - 재생사업지구계획사업 공사 착수 : 2026년 하반기
- 인천광역시 산업입지과와 긴밀한 협의로 사업 수행 원활화

부진사유 및 대책

- 市 추진 국토부 공모사업으로 지구계획수립 및 관계기관 협의 등 변수가 발생하여 계획이 지연됨
- 인천지방·기계산업단지 재생사업지구계획 중간보고회(2025. 9. 23.)에서 인천교공원 내 지하주차장 조성 계획을 市 공원조성과, 동구청이 반대 의견 제출하여 대체지 검토 중(2025. 12. 8. 용역 중지)

투자계획

비예산

1-16-1 (일자리정책과)		미추홀구 기업에 맞는 일자리 발굴로 지역맞춤형 일자리를 창출하겠습니다.				팀 장 변혜연 (7953)	
사업목표		미추홀구 기업에 맞는 일자리 발굴 및 교육으로 지역맞춤형 일자리 창출				담당자 김승희 (7908)	
추진율		100%					
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	721		○			

개 요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 미추홀구 주민(청년, 신중년, 경력단절여성)
- 사업내용
 - 관내 고용 환경 및 기업 맞춤형 직업훈련교육 추진
 - 일자리발굴단 운영으로 기업에 맞는 일자리 발굴 및 취업연계
- 추진방법: 공모사업(상생일자리 지원사업) 및 구 자체사업

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	<ul style="list-style-type: none"> 2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 추진(4개 사업) - 직업훈련교육 등을 통한 전문인력 양성, 관내 기업(사업장) 취업연계 일자리지원센터 주관 일자리발굴단 운영을 통한 취업연계 	100%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> 2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 추진 - 직업훈련교육 등을 통한 전문인력 양성, 관내 기업(사업장) 취업연계 일자리지원센터 주관 일자리발굴단 운영을 통한 취업연계 	100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> 2024년 상생일자리 지원사업 추진 - 직업훈련교육 등을 통한 전문인력 양성, 관내 기업(사업장) 취업연계 일자리지원센터 주관 일자리발굴단 운영을 통한 취업연계 	100%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> 2025년 상생일자리 지원사업 추진 - 직업훈련교육 등을 통한 전문인력 양성, 관내 기업(사업장) 취업연계 일자리지원센터 주관 일자리발굴단 운영을 통한 취업연계 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> 2026년 상생일자리 지원사업 추진 - 직업훈련교육 등을 통한 전문인력 양성, 관내 기업(사업장) 취업연계 일자리지원센터 주관 일자리발굴단 운영을 통한 취업연계 	100%

※ 2024년부터 지역산업맞춤형 일자리사업 → 상생일자리 지원사업으로 개칭

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 선정	목표 8건	3건	2건	1건	1건	1건	
	실적 12건	4건	4건	2건	2건	-	
일자리지원센터 일자리발굴단 운영	목표 112회	32회	20회	20회	20회	20회	20회
	실적 92회	32회	20회	20회	20회	-	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 추진

- 2022년: 총 4개 사업(고용노동부 사업 1건 외 인천시 공모사업 3건)
- 2023년: 총 4개 사업(고용노동부 사업 2건 외 인천시 공모사업 2건)

상생일자리 지원사업 공모 선정

- 2024년: 총 2개 사업(인천시 공모사업 2건)
- 2025년: 총 2개 사업(인천시 공모사업 2건)

일자리지원센터 주관 일자리발굴단 운영

- 양질의 일자리 발굴을 위한 고용수요 확인 및 애로사항 청취
- 2022년: 32회 운영[213개 기업(체)]
- 2023년: 20회 운영[134개 기업(체)]
- 2024년: 20회 운영[188개 기업(체)]
- 2025년: 20회 운영[253개 기업(체)]

향후 추진계획

상생일자리 지원사업 지속 추진

- 지역 내 수요를 반영한 직업훈련교육 추진으로 인재 양성 및 일자리 연계

일자리지원센터 주관 일자리발굴단 운영을 통한 취업 연계

- 양질의 일자리 발굴을 위한 기업(체) 방문 일자리발굴단 운영: 연 20회
- 기업 애로사항 청취 등 소통으로 공공기관 취업 연계 네트워크 강화

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	721	160	174	201	89	97	-	721
국비	130	65	65	-	-	-	-	130
시비	489	85	95	160	71	78	-	489
구비	102	10	14	41	18	19	-	102

1-17-1
(경제지원과)

침체된 국가산업단지 활성화 도모를 위한 우수기업을 유치하겠습니다.

팀 장 신영석(4671)
담당자 조정훈(4677)
김승원(4672)

사업목표		침체된 국가산업단지 활성화 도모를 위한 우수기업 유치 지원		추진율	100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계			협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	
단기	자체	1,103.7		○		

개 요

☐ 중소기업 지원을 통한 우수기업 유치

- 사업기간: 매년 2월~12월(연간 계속 사업)
- 지원대상: 미추홀구 내 중소(제조)기업
- 총사업비: 210,700천 원(기금 117,200천 원, 구비 88,000천 원, 시비 5,500천 원)
- 2025년 사업내용
 - 맞춤형 입찰정보 제공사업 : 13,200천 원(기금)
 - 중소기업 지식재산 창출 및 기술지원단 사업 : 60,000천 원(기금)
 - 국제 지식재산권 분쟁예방컨설팅 지원사업 : 20,000천 원(기금)
 - 해외전시회 지원사업 : 24,000천 원(기금)
 - 해외시장개척단 파견 지원 : 58,000천 원(구비)
 - 중소기업 국내외 우수인증 획득 지원사업 : 30,000천 원(구비)
 - 우수공예품 생산업체 개발장려금 : 5,500천 원(시비)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 업종고도화 및 집적화 지원사업 계획 및 실시 • 중소기업지원 실시	100%
2023년	• 업종고도화 및 집적화 지원사업 계획 및 실시 • 중소기업지원 실시	100%
2024년	• 업종고도화 및 집적화 지원사업 계획 및 실시 • 중소기업지원 실시	100%
2025년	• 업종고도화 및 집적화 지원사업 계획 및 실시 • 중소기업지원 실시	100%
2026년	• 업종고도화 및 집적화 지원사업 계획 및 실시 • 중소기업지원 실시	100%

공약달성 확인지표

추진실적

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
업종고도화 및 집적화 지원사업 (지원사업 계획 건)	목표	45건	9건	9건	9건	9건	9건
	실적	369건	9건	9건	9건	9건	-
중소기업지원 실시 (지원 혜택 중소기업 수)	목표	300개	60개	60개	60개	60개	60개
	실적	277개	72개	68개	64개	73개	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%

향후 추진계획

- 중소기업 지원사업 지속 추진 및 추가 사업 발굴
 - 2026년 기업지원사업 안내문 배포 및 홍보
 - 중소기업 지원사업에 대한 의견 조회 및 수요조사 실시 예정

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,103.7	217	246	219.5	210.7	210.5	1,103.7
시비	23	4	4	4	5.5	5.5	23
구비	1,080.7	213	242	215.5	205.2	205	1,080.7

※ 2026년 맞춤형 입찰정보 제공사업 사업비 삭감 및 우수공예품 생산업체 개발장려금 사업비 증액으로 인한 사업비 조정으로 연도별 투자계획 변경

1-18-1
(일자리정책과)

종합일자리지원센터 조성으로 일자리 컨트롤 타워를 구축하겠습니다.

팀 장	변혜연 (7953)
담당자	윤명화 (7417)

사업목표	종합일자리창업지원센터 조성으로 일자리 컨트롤 타워 구축 - 노인일자리, 청년일자리 등 통합적으로 관리	추진율	100%
------	--	-----	------

사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	205		○			

개 요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 관내 기업체 및 구직자
- 운영인력: 직업상담사 총 4명
- 사업내용
 - 기업(구인 업체) 맞춤형 일자리 발굴 및 구직자 취업 연계
 - 노인·청년 등 다양한 계층을 위한 맞춤형 취업지원서비스 제공

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 일자리지원센터 운영을 통한 상담 및 취업 연계: 연중 • 일자리발굴단 운영 및 채용행사 등 맞춤형 취업지원서비스 제공	100%
2023년	• 일자리지원센터 운영을 통한 상담 및 취업 연계: 연중 • 일자리발굴단 운영 및 채용행사 등 맞춤형 취업지원서비스 제공	100%
2024년	• 일자리지원센터 운영을 통한 상담 및 취업 연계: 연중 • 일자리발굴단 운영 및 채용행사 등 맞춤형 취업지원서비스 제공	100%
2025년	• 일자리지원센터 운영을 통한 상담 및 취업 연계: 연중 • 일자리발굴단 운영 및 채용행사 등 맞춤형 취업지원서비스 제공	100%
2026년	• 일자리지원센터 운영을 통한 상담 및 취업 연계: 연중 • 일자리발굴단 운영 및 채용행사 등 맞춤형 취업지원서비스 제공	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별						
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
일자리창출 실적 (고용서비스)	목표	8,117건	2,117건	1,500건	1,300건	1,300건	1,300건	
	실적	6,824건	2,117건	2,065건	1,308건	1,334건	-	
취업지원서비스 제공	목표	295회	95회	50회	50회	50회	50회	
	실적	307회	95회	94회	58회	60회	-	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%		

※ 목표 산출: 직업상담사 수 x 325건

- 직업상담사 7명, 목표 2,100명 → 2024년 직업상담사 4명, 목표 1,300명

- 직업상담사 1인당 목표 300명 → 325명(25명 상향 조정/영업일 기준 1일 1.3명 취업)

추진실적

□ 일자리지원센터 상담 및 취업 연계 운영 실적(2025. 12. 24. 기준) (단위: 건, 명)

연도	구직신청	구인신청	알선	방문상담	전화상담	취업
2022년	3,189	1,090	12,098	3,212	24,126	2,122
2023년	2,729	1,220	11,714	2,507	22,551	2,065
2024년	2,576	1,204	10,750	1,992	16,264	1,308
2025년	2,565	1,349	13,091	1,884	17,184	1,334

□ 일자리지원센터 맞춤형 취업지원서비스 제공 실적(2025. 12. 24. 기준)

사업명	추진실적			
	2022년	2023년	2024년	2025년
채용행사 운영	10회, 109개 기업 참여, 취업 116명	11회, 112개 기업 참여, 취업 185명	6회, 107개 기업 참여, 취업 146명	7회, 63개 기업 참여, 취업 111명
구직 이동상담	45회, 179명 취업 상담, 취업 70명	54회, 403명 취업 상담, 취업 92명	24회, 331명 취업 상담, 취업 81명	24회, 358명 취업 상담, 취업 101명
일자리발굴단	32회, 213개 기업 방문	20회, 134개 기업 방문	20회, 188개 기업 방문, 취업 92명	20회, 253개 업체 방문, 79명 취업
동행면접	7회, 22명 참여, 취업 8명	5회, 30명 참여, 취업 21명	4회, 38명 참여, 취업 13명	5회, 138명 참여, 33명 취업
취업역량교육	1회, 19명 교육 수료생 참여	4회, 39명 교육 수료생 참여	4회, 77명 교육 수료생 참여	4회, 78명 교육 수료생 참여

□ 우리 동네 맞춤형 일자리 채용대행서비스 개최

- 시 기: 2023. 2월, 6월
- 대 상: 중장년층 및 고령층(모집인원: 총 78명)

□ 2024년 상·하반기 마추홀구 채용박람회 개최

- 시 기: 2024. 6월, 11월
- 대 상: 취업을 희망하는 구직자

□ 2025년 마추홀구 채용박람회 개최

- 시 기: 2025. 6월
- 대 상: 취업을 희망하는 구직자
- 내 용: 구인업체와 구직자의 1:1 현장면접 실시, 간접 참여업체 구인현황 현수막 게시 및 이력서 접수대행, 구직자들의 적극적 참여유도를 위한 부대행사 실시

향후 추진계획

□ 다양한 취업 취약계층을 위한 맞춤형 일자리지원센터 운영

- 수요자 중심의 개인별 1:1 구인·구직 상담, 취업 알선
- 구직 성공을 위한 취업지원서비스(5종) 제공
 - 채용행사, 이동상담, 동행면접, 일자리발굴단, 취업역량교육 추진

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	205	41	49	42	37	36	-	205
시비	35	6	10	6	7	6	-	35
구비	170	35	39	36	30	30	-	170

※ 2025년 군·구 일자리지원기능 강화 보조금 내시 변경으로 인한 예산 변경[市 경제정책과-3604(2025. 3. 18.호)]

1-18-1 (일자리정책과)		종합일자리지원센터 조성으로 일자리 컨트롤 타워를 구축하겠습니다.				팀 장 황화선 (7994)	담당자 장지용 (7991)
사업목표		종합일자리창업지원센터 조성으로 일자리 컨트롤 타워 구축 - 창업집적장소(창업촌) 마련 및 창업교육(상담) 지원				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
단기	자체	266	완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	

개 요

□ K콘텐츠 청년창업실 조성 및 운영

- 사업장소: 홉플러스 인하점 2층 「두레온」 내 (소성로 6)
- 사업규모: 119.8㎡(전체 면적) 중 청년창업실 공간 86.8㎡(약 26평)
- 사업내용
 - K콘텐츠 특화 청년창업실 운영으로 공실 발생 시 콘텐츠 분야* (예비)창업 입주 희망 기업 공모
 - * 콘텐츠만화(웹툰), 애니메이션, 캐릭터, 방송영상, 게임, 음악, 뉴콘텐츠·실감콘텐츠(XR,MR,VR,AR 등), 지식정보, 콘텐츠솔루션 등
 - 청년창업 업무공간(독립형) 및 회의실 등 공용공간 무상 지원
- 추진현황: 콘텐츠 관련 청년창업 기업 4개소 입주(2024. 6. 30. 기준)

□ 창업교육 지원 추진

- 사업내용: K콘텐츠 청년창업실 및 청년창업 특화거리 입주 청년창업가를 대상으로 교육 및 컨설팅 집중 운영
- 추진내용: 창업교육 및 맞춤형 컨설팅 추진

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 창업집적장소를 통한 창업공간 마련 및 맞춤형 창업교육 실시	100%
2023년	• 창업집적장소를 통한 창업공간 마련 및 맞춤형 창업교육 실시	100%
2024년	• 창업집적장소를 통한 창업공간 마련 및 맞춤형 창업교육 실시	100%
2025년	• 창업집적장소를 통한 창업공간 마련 및 맞춤형 창업교육 실시	100%
2026년	• 창업집적장소를 통한 창업공간 마련 및 맞춤형 창업교육 실시	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
창업집적장소 운영	목표 1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소
	실적 1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	-
맞춤형 창업교육 실시	목표 20회	4회	4회	4회	4회	4회	4회
	실적 30회	4회	13회	5회	8회	-	-
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 창업집적장소(창업촌) 마련: 「K콘텐츠 청년창업실」 운영(5개소 입주)
- 2023 창업 성장 및 서비스 고도화를 위한 업체별 전문 컨설팅 실시(11회)
- 2023 청년 창업 교육(브랜딩 및 자기 PR 기법 등) 실시(2회)
- 2024 청년 창업 교육(SNS를 활용한 마케팅 과정 등) 실시(5회)
- 콘텐츠 분야 청년창업실 입주자 선정 및 입주계약 체결
- 2025 청년 창업가별 맞춤형 컨설팅 실시(8회)

향후 추진계획

- K콘텐츠 청년창업실 운영 및 관리
- 전문 컨설팅 및 맞춤형 창업 교육 실시

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산	
		2022	2023	2024	2025	2026		
계	266	70	125	54	10	7	-	266
국비	27	-	24	3	-	-	-	27
구비	239	70	101	51	10	7	-	239

1-19-1 (경제지원과)		지역경제 활성화 사업을 추진하겠습니다.				팀 장 이명희(4381) 신영석(4671)	추진율 100%
사업목표 지역경제 활성화 사업 추진(일자리 포함)						담당자 이명희(4382) 임수빈(4385)	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
단기	자체	1,103	완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	

개 요

미추홀구 지역상권 상생 및 활성화 조례 제정

- 법적근거: 「지역상권 상생 및 활성화에 관한 법률」 및 같은 법 시행령
- 지역상권 상생 및 지역경제 활성화 도모

「골목형상점가」 활성화(일자리 창출)

- 골목형상점가 가능지역 발굴(행정복지센터 수요조사 및 신청 등)
- 골목형상점가 발굴 후 상인회 구성 지원
- 전통시장 및 상점가 활성화 공모사업 신청

소상공인을 위한 특례보증 및 이차보전금 지원사업

- 특례보증을 통한 용자지원(업체당 3천만 원 이내)
- 지역경제활성화기금을 통한 대출이자 지원(연 2%)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	<ul style="list-style-type: none"> • 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화 조례 제정 • 소상공인을 위한 특례보증 및 이차보전금 지원사업 - 신용보증재단 특례보증 출연금 지급을 통한 신용보증 지원 - 용자 시 대출이자 지원(연 2%) 	60%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 대상지 수요조사(행정복지센터, 홈페이지 등) • 골목형상점가 선정 및 상인회 구성 • 소상공인을 위한 특례보증 및 이차보전금 지원사업 - 신용보증재단 특례보증 출연금 지급을 통한 신용보증 지원 - 용자 시 대출이자 지원(연 2%) 	80%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> • 대상지 수요조사(행정복지센터, 홈페이지 등) • 골목형상점가 선정 및 상인회 구성(1개소 이상 발굴): 미선정 • 2025년도 [중기부] 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 신청 • 소상공인을 위한 특례보증 및 이차보전금 지원사업 - 신용보증재단 특례보증 출연금 지급을 통한 신용보증 지원 - 용자 시 대출이자 지원(연 2%) 	100%

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2025년	<ul style="list-style-type: none"> • 대상지 수요조사(행정복지센터, 홈페이지 등) • 골목형상점가 선정 및 상인회 구성(1개소 이상 발굴) • 2025년도 [중기부] 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 선정 • 소상공인을 위한 특례보증 및 이차보전금 지원사업 - 신용보증재단 특례보증 출연금 지급을 통한 신용보증 지원 - 용자 시 대출이자 지원(연 2%) 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> • 대상지 수요조사(행정복지센터, 홈페이지 등) • 골목형상점가 선정 및 상인회 구성(1개소 이상 발굴) • 공모사업 신청 및 추진 • 소상공인을 위한 특례보증 및 이차보전금 지원사업 - 신용보증재단 특례보증 출연금 지급을 통한 신용보증 지원 - 용자 시 대출이자 지원(연 2%) 	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
미추홀구 지역상권 상생 및 활성화 조례 제정	목표	1건					
	실적	1건					
골목형상점가 발굴 및 선정	목표	4건	1건	1건	1건	1건	
	실적	3건	2건		1건	-	
소상공인 특례보증 지원 추천 건수	목표	405건	75건	75건	80건	85건	90건
	실적	369건	113건	102건	73건	81건	-
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 제정 : 2022. 10. 17.
- 골목형상점가 지정(인하문화의 거리 골목형상점가) : 2023. 1. 6.
- 골목형상점가 지정(계물포 골목형상점가) : 2023. 7. 24.
- [중기부 선정] 골목형상점가 지원기관과 우리 구 골목형상점가 연계 지원 (행정업무 및 온누리상품권 가맹 지원) : 2024. 7. 19.
- 미추홀구 골목형상점가 지정 및 활성화 지원에 관한 조례 개정 : 2024. 8. 12.
- 2025년도 [중기부] 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 신청 (시장경영패키지-시장매니저, 배송매니저 부문) 인하문화의 거리 골목형상점가 : 2024. 9. 11.
- 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 개정 : 2024. 11. 11.

- 2025년도 [중기부] 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 선정 : 2025. 1. 7.
(시장경영패키지-시장매니저, 배송매니저 부문) 인하문화의 거리 골목형상점가
 - 소상공인 특례보증 지원사업 추진계획 수립 : 2025. 1. 10.
 - 골목형상점가 지정(인하대 후문 골목형상점가) : 2025. 2. 12.
 - 2025년 우리마을 상인회 활성화 지원사업 공모 선정(제물포 골목형상점가) : 2025. 4. 2.
-
- 2022~2025 소상공인 특례보증 369건 추천(목표 315건)
- 2022년 113건, 2023년 102건, 2024년 73건, 2025년 81건

향후 추진계획

- 정책지원에서 소외된 골목상권을 적극 발굴, 「골목형상점가」로 등록하여 법적 지위 부여 및 각종 사업 지원을 통해 지역경제 활성화 도모
- 담보 여력이 부족한 관내 소상공인에 대한 특례보증 및 대출이자 지원으로 경영 안정화 및 지역 경제 활성화 도모

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	입기 후	
계	1,103	294	220	261	166	162	-	1,103
시비	45	-	-	41	3	1	-	45
구비	1,058	294	220	220	163	161	-	1,058

1-20-1 (경제지원과)		전통시장 활성화 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	이명희(4381)
						담당자	이창훤(4382) 윤세영(4383) 김지석(4386)
사업목표		전통시장 활성화 사업 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	21,114		○			

개요

- 전통시장 및 상점가 육성을 위한 시설현대화사업 추진
 - 전통시장 현황: 15개소(정상영업 7개소)
 - 지하상가 현황: 4개소(정상영업 4개소)
- 전통시장 경영혁신사업
 - 특성화시장 육성사업: 디지털 전통시장 육성사업
 - 공동마케팅
 - 매니저 지원사업
 - 공동배송서비스 지원사업

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	<ul style="list-style-type: none"> • 전통시장 시설현대화사업 <ul style="list-style-type: none"> - 주안시민지하상가 캐노피 설치공사 등 6개 추진 완료 - 전통시장 내 편의시설 제공 • 전통시장 경영혁신사업 <ul style="list-style-type: none"> - 특성화시장 육성사업(석바위시장, 용현시장, 신기시장) - 매니저 지원사업(남부종합, 석바위, 용현, 토지금고, 학익시장) - 공동배송서비스 지원사업(석바위, 용현, 토지금고시장) 	100%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 전통시장 시설현대화사업 및 주차환경개선사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 용남시장 소방시설 보수공사 등 6개 추진 완료 - 신기시장 야케이드 설치(2023~2025) 및 보수공사(2023~2024) - 남부종합시장 공영주차장 조성사업(2023~2025) • 2024년 전통시장 시설현대화사업 및 주차환경개선사업 신청 • 전통시장 경영혁신사업 <ul style="list-style-type: none"> - 특성화시장 육성사업(용현시장, 신기시장, 석바위시장) - 매니저 지원사업(7개소 추진) - 공동배송서비스 지원사업(3개소 추진) 	100%

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2024년	<ul style="list-style-type: none"> 전통시장 시설현대화사업 및 주차환경개선사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 신기시장 아케이드 보수공사(2023~2024) 등 5개 완료 - 용남시장, 토지금고시장, 신기시장, 남부종합시장 매설식 소화전 설치공사(2024~2025) - 남부종합시장 광영주차장 조성사업(2023~2025) 2025년 전통시장 시설현대화사업 신청 전통시장 경영혁신사업 <ul style="list-style-type: none"> - 특성화시장 육성사업(석바위시장, 토지금고시장) - 매니저 지원사업(6개소 추진) - 공동배송서비스 지원사업(3개소 추진) 	100%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> 전통시장 시설현대화사업 및 주차환경개선사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 남부종합시장 외 3개소 매설식 소화전 설치공사(2024~2025) - 신기시장 아케이드 신축(2023~2025) - 남부종합시장 광영주차장 조성사업(2023~2025) - 용현시장 방송설비 정비공사 외 6건 준공 2026년 전통시장 시설현대화사업 신청 전통시장 경영혁신사업 <ul style="list-style-type: none"> - 특성화시장 육성사업(토지금고시장) - 매니저 지원사업(5개소 추진) - 공동배송서비스 지원사업(3개소 추진) 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> 2026년 전통시장 시설현대화사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 용남시장 소방전기공사 - 남부종합시장 CCTV 설치공사 - 용현시장 비둘기 퇴치시스템 유지보수공사 2027년 전통시장 시설현대화사업 신청 전통시장 경영혁신사업 <ul style="list-style-type: none"> - 특성화시장 육성사업(2개소 추진 예정) - 매니저 지원사업(5개소 추진 예정) - 공동배송서비스 지원사업(3개소 추진 예정) 	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시설현대화사업 추진 완료	목표	26건	6건	8건	4건	4건	4건
	실적	24건	6건	6건	5건	7건	-
경영혁신사업 추진 완료	목표	12건	3건	3건	2건	2건	2건
	실적	12건	3건	3건	3건	3건	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%

추진실적

- 2022 전통시장 시설현대화사업
 - 주안시민지하상가 캐노피 설치공사
 - 용남시장 입구간판 및 아케이드 도장공사, 점포돌출간판 교체공사
 - 토지금고시장 전동 어닝 설치공사, CCTV 추가 설치공사, 상인회 건물 보수공사
- 2022 전통시장 경영혁신사업
 - 특성화시장 육성사업 : 석바위시장, 용현시장, 신기시장
 - 매니저 지원사업 : 남부종합시장, 석바위시장, 용현시장, 토지금고시장, 학익시장
 - 공동배송서비스 지원사업 : 석바위시장, 용현시장, 토지금고시장
- 2023 전통시장 시설현대화사업
 - 주안시민지하상가 캐노피 설치공사
 - 신기시장 아케이드 설치 및 보수공사 설계용역, 신기시장 소방시설 보수공사
 - 남부종합시장 소방시설 보수공사
 - 석바위지하상가 CCTV 설치공사
 - 용남시장 소방배관 보수공사, 소방시설 보수공사
- 2023 전통시장 경영혁신사업
 - 특성화시장 육성사업 : 석바위시장, 용현시장, 신기시장
 - 매니저 지원사업 : 남부종합시장, 용현시장, 토지금고시장, 학익시장, 신기시장, 용남시장, 석바위시장
 - 공동배송센터 운영사업 : 용현시장, 토지금고시장, 석바위시장
- 2024 전통시장 시설현대화사업
 - 용남시장 소방시설 보수공사, 우수배관 보수공사 공사, 노후전선 정비사업 공사
 - 용현시장 공용전기 정비공사
 - 신기시장 아케이드 보수공사(2023~2024)
- 2024 전통시장 경영혁신사업
 - 특성화시장 육성사업 : 디지털전통시장(1년차: 토지금고/2년차: 석바위)
 - 매니저 지원사업 : 남부종합시장, 용현시장, 토지금고시장, 학익시장, 신기시장, 용남시장, 석바위시장
 - 공동배송센터 운영사업 : 용현시장, 토지금고시장, 석바위시장
- 2025 전통시장 시설현대화사업
 - 용남시장, 토지금고시장, 신기시장, 남부종합시장 매설식 소화전 설치공사(2024~2025)
 - 용현시장 방송설비 정비공사, 공중화장실 리모델링 공사
 - 남부종합시장 방송설비 정비공사
 - 석바위시장 증발냉방장치(쿨링포그) 설치공사
 - 인하문화의 거리 경관조명 설치공사
 - 주안시민지하도상가 캐노피 설치공사
- 2025 전통시장 경영혁신사업
 - 특성화시장 육성사업 : 디지털전통시장(2년차: 토지금고)
 - 매니저 지원사업 : 용남시장, 용현시장, 석바위시장, 신기시장, 학익시장
 - 공동배송센터 운영사업 : 용현시장, 석바위시장, 신기시장

향후 추진계획

- 전통시장 시설현대화사업 추진
- 전통시장 경영혁신사업 추진

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	21,114	2,075	13,889	3,310	1,594	246	-	20,868
국비	8,584	646	6,030	1,908	-	-	-	8,584
시비	8,273	917	4,875	1,113	1,180	188	-	8,085
구비	3,817	438	2,698	284	356	41	-	3,776
기타	440	74	286	5	58	17	-	423

※ 2026년 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업 공모사업 선정 결과에 따른 투자계획 금액 변경
 ※ 2026년 국·시비 경영현대화 사업 확정 지연에 따른 사업비 미확정(1월 중 확정 및 교부 예정)

1-21-1 (경제지원과)		상생지원센터 설치를 추진하겠습니다.				팀 장	이명희 (4381)
						담당자	이창현 (4382)
사업목표		상생지원센터 설치 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	2.98	○				

개 요

□ 사업목적

- 대규모점포 및 준대규모점포와 지역중소유통기업의 균형발전
 - 유통업상생발전협의회가 유통산업발전법에 의거 기 구성됨: 2020. 2. 2.
- 전통시장과 대형마트·기업형 슈퍼마켓 간 발생할 수 있는 문제들을 사전에 협의하고 조정하는 상생지원센터(가칭) 설치

□ 추진근거

- 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 제정: 2022. 10. 17.

□ 상생지원센터 개소(경제지원과): 2025. 1월

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	<ul style="list-style-type: none"> • 유통업상생발전협의회 2회 개최 • 인천광역시 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 제정 • 미추홀구 조직개편 시 상생지원센터 설치 의견(안)제출 	25%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 상생지원센터(가칭) 설치 따른 관련부서 협의 추진 • 상생지원센터(가칭) 설치 기본계획(안) 수립 	50%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> • 상생지원센터(가칭) 세부운영 계획(안), 상생지원센터(가칭) 인력채용계획 수립 → 상생지원센터(가칭) 설치운영 계획(안) 수립 • 인천광역시 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 개정 	75%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> • 상생지원센터(가칭) 운영 	100%

공약달성 확인지표

확인지표	실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
· 마추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례안 제정	목표	1건	1건				
	실적	1건	1건				
· 상생지원센터(가칭) 기본계획(안) 수립	목표	1건	1건				
	실적	1건	1건				
· 상생지원센터(가칭) 세부운영계획(안) 수립	목표	2건		2건			
	실적	1건		1건			
· 상생지원센터(가칭) 인력채용계획 수립 → 상생지원센터(가칭) 설치운영 계획(안)	목표	1개소			1개소		
	실적	1개소			1개소		
· 상생지원센터(가칭) 운영	목표						
	실적						
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%		

추진실적

- 마추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 제정 : 2022. 10. 17.
- 마추홀구 상생지원센터(가칭) 기본계획(안) 수립 : 2023. 12월
- 마추홀구 상생지원센터(가칭) 설치운영 계획(안) 수립 : 2024. 1. 12.
- 마추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 개정 : 2024. 11. 11.
- 상생지원센터 개소(경제지원과) : 2025. 1월

향후 추진계획

- 상생지원센터 운영 : 안건 발생 시

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	2.98	0.98	2	-	-	-	-	2.98
구비	2.98	0.98	2	-	-	-	-	2.98

※ 당초 별도 센터 운영 예정으로 소요액 600백만 원 계상하였으나, 세부 운영 구체화 과정에서 기존 물적, 인적 자원 활용 계획으로 사업예산 비예산으로 책정하여 소요예산 감소함

1-22-1 (경제지원과)		관내 소상공인 대상 직업능력개발 계획을 수립하겠습니다.				팀 장	신영석 (4671)
						담당자	김승원 (4675)
사업목표		관내 소상공인(자영업자, 플랫폼노동자 등) 직업능력개발 계획 수립으로 업종전환 및 재취업 지원 확대				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	86.4		○			

개 요

- 추진근거
 - 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제9조(소상공인의 경영 안정 등 지원)
 - 「인천광역시 마추홀구 소상공인 지원에 관한 조례」 제7조(지원사업)
- 소상공인 역량강화를 위한 컨설팅(창업지도 및 경영문제 해결 등) 지원
 - 경영 애로 해소 및 경영위기 극복을 위한 각 분야별 전문 컨설턴트가 사업체를 찾아가는 맞춤형 컨설팅 제공(업체별 4회 컨설팅 지원)
 - 경영진단, 노무, 세무, 온라인마케팅, 마케팅 및 판로개척 등
- 소상공인(자영업자, 플랫폼노동자* 등)의 재창업 및 임금근로자 전환을 위한 취업 교육 지원(2024년 사업 종료)
 - 폐업(예정) 소상공인을 위한 재창업 및 취업 교육을 통해 재도전을 위한 기본 역량 강화 기회 제공
 - 재창업 역량 강화: 소비트렌드 및 입지상권분석, 사업계획서 작성 등
 - 재취업 역량 강화: 새로운 경력경로 탐색, 재도약을 위한 구직활동 이해 등

* 플랫폼노동자란?

앱이나 SNS 등 디지털 플랫폼을 매개로 노동이 거래되는 고용 형태에 종사하는 노동자를 의미하며 대표적으로 배달 대행이나 대리운전 등을 하는 노동자

※ 소상공인 재창업 및 재취업 지원 사업의 경우 예산 및 인프라 등에서 타기관 사업을 활용하는 것이 효율적이라고 판단되어 소상공인 컨설팅 사업에 역량 집중 예정

[2025년 소상공인 맞춤형 컨설팅 지원 사업 계획 / 경제지원과-9866(2025. 2. 5.)호]

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2023년	<ul style="list-style-type: none"> 소상공인 대상 직업능력개발 계획 수립 소상공인 역량강화 및 재취업, 재창업교육 지원 	100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> 소상공인 대상 직업능력개발 계획 수립 소상공인 역량강화 및 재취업, 재창업교육 지원 	100%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> 소상공인 역량 강화를 위한 맞춤형 컨설팅 지원 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> 소상공인 역량 강화를 위한 맞춤형 컨설팅 지원 	100%

- 기본계획 및 사업 홍보방안 수립 : 2025. 2월
- 사업 홍보 및 참여업체 모집 : 2025. 2월~3월
- 신청 업체 서류 검토 : 2025. 3월
- 1차 컨설팅 완료(5개 업체) : 2025. 4월~6월
- 2차 컨설팅 완료(8개 업체) : 2025. 8월~9월
- 만족도 조사 및 결과 보고 : 2025. 10월~11월
- 소상공인 재취업, 재창업 교육 100건(소상공인시장진흥공단 등 실적)
 - 타기관 소상공인 재취업·재창업 교육 지속적 홍보 및 관내 업체 실적 관리(소상공인시장진흥공단 등 협조 요청)

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
소상공인 맞춤형 컨설팅	목표	45개소		15개소	10개소	10개소	10개소	
	실적	39개소		16개소	10개소	13개소	-	
소상공인 재취업, 재창업 교육	목표	90개소		30개소	20개소	20개소	20개소	
	실적	169개소		34개소	35개소	100개소	-	
당해 연도 목표 달성률				100%	100%	100%	%	

추진실적

- 기본계획 수립 및 컨설턴트, 외부강사 모집 : 2023. 5월
 - 사업 홍보 및 참여업체 모집 : 2023. 6월
 - 소상공인 맞춤형컨설팅 실시 : 2023. 7~10월
 - 소상공인 재취업, 재창업 교육 실시 : 2023. 7월
 - 만족도 조사 및 평가 : 2023. 7월/10월
-
- 기본계획 및 사업 홍보방안 수립 : 2024. 1월
 - 사업 홍보 및 참여업체 모집 : 2024. 2월
 - 소상공인 맞춤형 컨설팅 실시 : 2024. 3월~계속
 - 소상공인 재창업 교육 실시 : 2024. 3. 12.~3. 15.(4일간)
 - 소상공인 재취업 교육 실시 : 2024. 3. 19.~3. 22.(4일간)
 - 만족도 조사 및 평가 : 2024. 3월
 - 소상공인 맞춤형 컨설팅 실시 : 2024. 4월~5월
 - 만족도 조사 및 평가 : 2024. 4월~5월

향후 추진계획

- 소상공인 맞춤형 컨설팅 지원**
 - 기본계획 및 사업 홍보방안 수립 : 2026. 1월
 - 사업 홍보 및 참여업체 모집(1차) : 2026. 2월~3월
 - 1차 컨설팅 진행(5개 업체) : 2026. 4월~6월
 - 사업 홍보 및 참여업체 모집(2차) : 2026. 5월~6월
 - 2차 컨설팅 진행(5개 업체) : 2026. 7월~9월
 - 만족도 조사 및 결과 보고 : 2026. 10월~11월
- 소상공인 재취업·재창업 교육**
 - 타기관 소상공인 재취업·재창업 교육 지속적 홍보 및 관내 업체 실적관리 (소상공인시장진흥공단 등 협조 요청)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	86.4	-	34	19	19	14.4	-	86.4
구비	86.4	-	34	19	19	14.4	-	86.4

※ 소상공인 재창업·재취업 교육 타기관 사업 활용에 따라 2026년 투자계획 변경
