

“견본”

[별지 제1호서식]

공동주택 보조금 신청서

신청자	신청인 (입주자대표, 관리주체)	홍길동		연락처 (팩스번호)		
	공동주택명	OO 아파트		사용검사일 (사용승인일)		
	주 소	인천 남구 특정리로 95 (송의동)				
	동 수	1	세대수	100		
	입주자대표회의 의 결 의	2018. 2. .		사 업 비 (자체부담) 확보 현황	4,000,000 원	
신 청 내 용						
사업명		사업비(원)			사업기간	
		총 계	자체부담	지원신청	착수예정	완료예정
광장 교체공사		1,110,000	3,855,000	3,855,000	2018. 4. .	2018. 5. .
		-				
		-				
		-				
총계		1,110,000	3,855,000	3,855,000		
인천광역시 남구 공동주택보조금 지원에 관한 조례 시행규칙 제4조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. 2018년 3 월 일 신청인 OO 입주자대표 홍길동 (인) 인천광역시 남구청장 귀하						
구비서류 : 사업계획서, 입주자대표회의 의결서, 견적서, 이행각서, 그 밖에 구청장이 필요하다고 인정하는 서류 등						

"견본"

[별지 제1호의2 서식]

공동주택 보조금 지원사업 계획서

□ 사업 개요

- 공동주택명 : 00 아파트
- 주 소 : 인천 남구 독장으로 95 (송의동)
- 연 락 처 : 032 - 880 - 4462
- 총 사업비 : 7,710,000 원
- 사업내용 : 담장 교체 공사

□ 사업 추진 계획

- 발주 : 2018 년 4 월
- 계약 : 2018 년 4 월
- 착공 : 2018 년 4 월
- 준공 : 2018 년 5 월

□ 사업(공사)량 산출 내역 (공사위치 · 범위 및 면적 등 산출 근거)

- 담장 교체 · 길이 : 15M · 높이 : 1.5M
- 시멘트 블록담장 (150X190X390 [단격])
- <※ 위치도, 물량산출 근거, 도면 등이 있는 경우 별도 첨부>


위와 같이 사업계획서를 제출합니다.

신청자 홍길동(인)

인천광역시 남구청장 귀하

"전본"

설계 도면

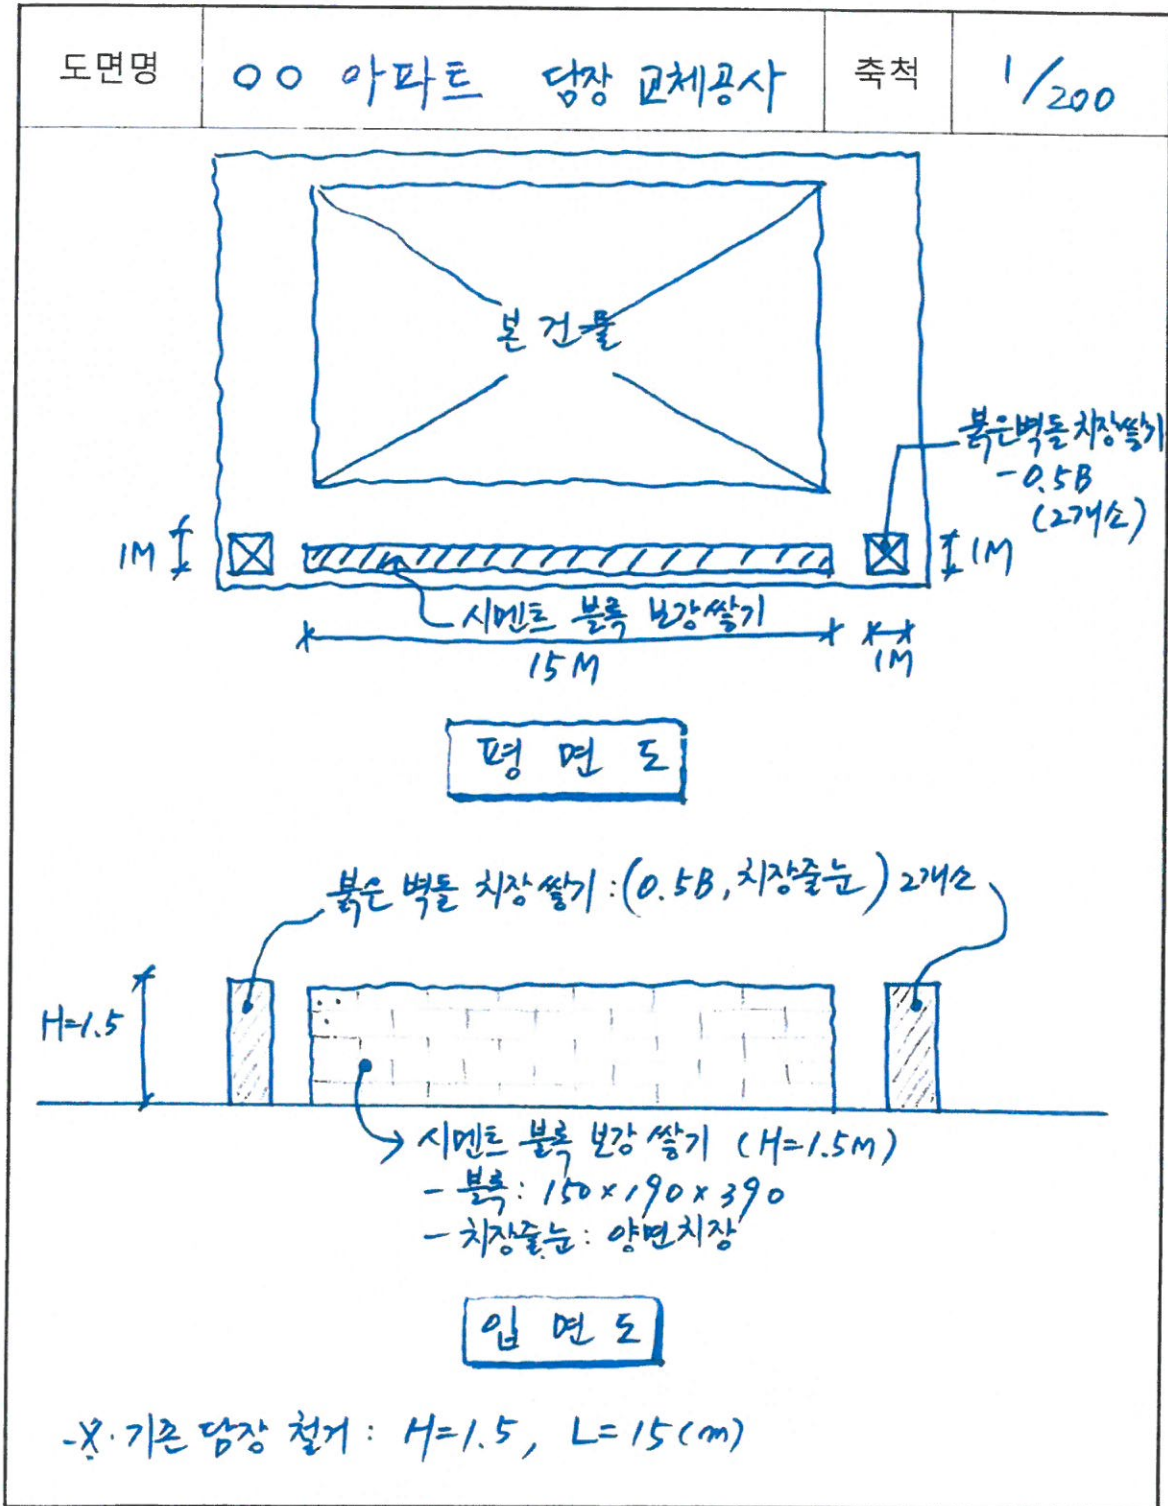

수 량 산 출 서

[illegible]

“견본”

공사원가계산서

공사명 ○○아파트 담장 교체 공사

비		목	금	액	구	성	비	비	고
공사비	직접재료비	직접재료비	281,235						
	노무비	직접노무비	1,713,573						
	간접비	직접노무비	152,507						
공사비	기계	기계	1,866,080						
	고산	고산	646,800						
	연건	연건							
	노인	노인							
	산업	산업							
	기환	기환							
	경	경							
	보	보							
	양	양							
	관	관							
일반관리비	계	계	2,910,070						
	반	반	174,604						
	관	관	420,515						
	리	리	3,505,189						
	비	비	350,518						
총			3,855,707						

“견본”

○○○파트 담당 교체 공사

품 명 ②	구 격	단 위 ③	수량 ④	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
건축물 현장정리	철근콘크리트조	M2	19			11,341	215,479			11,341	215,479	2012 적산자료 P76 수량산출서 1번
월기 및 부수기	무근 구조물, 소형장비 사용	M3	6.375	6,511	41,505	86,783	553,241	1,283	8,179	94,576	602,925	2012 적산자료 P81 수량산출서 2번
시멘트블록 보강쌓기	150*190*390	M2	22.5	10,266	230,985	35,162	791,145			45,428	1,022,130	2012 적산자료 P494 수량산출서 3번
치장준는	양면치장	M2	22.5	186	4,185	6,536	147,060			6,722	151,245	2012 적산자료 P495 수량산출서 3번
붉은벽돌 치장쌓기 및 준는	표준형 0.5B	매	12	380	4,560	554	6,648			934	11,208	2012 적산자료 P489 수량산출서 5번
페기물처리비	건설페기를	톤	15.3					26,936	412,120	26,936	412,120	2012 남동구 건설기준 수량산출서 4번
페기물상처리비	건설페기를	톤	15.3					4,500	68,850	4,500	68,850	2012 남동구 건설기준 수량산출서 4번
페기물운반비	건설페기를	톤	15.3					10,304	157,651	10,304	157,651	2012 남동구 건설기준 수량산출서 4번
[합 계]					281,235		1,713,573		646,800		2,641,608	
