
2025년 하반기 민선8기

공약 추진 사항 보고회 개최 결과 보고



스마트정책실

주요 내용

2025년 하반기 민선8기 공약 추진 사항 보고회 개최 결과 보고

□ 보고회 개요

- 일시/장소: 2025. 7. 25.(금) 10:00~11:30 중회의실
- 참석: 구청장, 부구청장, 5급 이상 간부 공무원(동장 제외)
- 보고자: 2025년 완료한 공약, 현재 추진 중인 공약 및 2025년도 목표 미달성한 공약의 주관 부서장
- 주요내용: 주요 공약 추진 실적 및 향후 계획 보고

□ 공약 추진 현황

- 총괄 추진 현황: **80.5%**

구분	세부 과제	추진율	이행 완료		추진 중			비고
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	
'25년 1분기	113	79.6%	9	81	22	1	-	폐기 1
'25년 2분기	113	80.5%	10	81	17	4	1	

- 분야별 추진 현황

구분	계	변화의 중심 미추출구	따뜻한 동행 미추출구	꿈이 실현되는 미추출구	건강과 안전지킴이 미추출구	구민과 공감하는 미추출구	
추진율	80.5%	53.6%	96.0%	90.5%	87.1%	75.0%	
세부 과제	113	28	25	21	31	8	
이행 완료	완료	10	3	3	1	3	-
	이행 후 계속 추진	81	12	21	18	24	6
추진 중	정상 추진	17	13	-	2	-	2
	일부 추진	4	-	-	-	4	-
	보류	1	-	1	-	-	-
투자 계획	계획(백만 원)	4,992,245	4,622,898	28,224	258,390	47,955	34,778
	확보(백만 원)	345,214	180,965	21,936	86,485	32,681	23,147

□ 향후 계획

- 공약 추진 현황 홈페이지 등 공개 : 2025. 8월 중
- 민선8기 미추출구 공약이행평가단 공약 조정 심의 : 2025. 11월 중

2025년 하반기 민선8기 공약 추진 사항 보고회 결과 보고

민선8기 미추홀구 공약 추진 사항 보고회를 개최하고 공약 추진 점검 결과를 아래와 같이 보고함

I 보고회 개요

- 일시/장소: 2025. 7. 25.(금) 10:00~11:30, 중회의실
- 참석자: 구청장, 부구청장, 5급 이상 간부 공무원(동장 제외)
- 보고자: 27개 공약 주관 부서장
 - 2025년 이행 완료한 공약 및 현재 추진 중인 공약의 주관 부서장
 - 2025년도 목표 미달성한 공약의 주관 부서장
- 주요내용: 주요 공약 추진 실적 및 향후 계획 보고, 질의 등

II 공약 현황

- 공약 기본 현황: 5대 분야/79개 공약/113개 세부 과제(중복 6개 포함)

5대 분야	계	변화의 중심 미추홀구	따뜻한 동행 미추홀구	꿈이 실현되는 미추홀구	건강과 안전지킴이 미추홀구	구민과 공감하는 미추홀구
공약 사항	79	22	12	17	21	7
세부 과제	113	28	25	21	31	8

- 실·국·소별 현황

구분	계	실	자치안전행정국	문화경제국	복지환경국	건설교통국	도시재생국	보건소
세부 과제	113	4	12	33	32	15	10	7

III

공약 추진 현황

□ 총괄 추진 현황: **80.5%** 달성

- 2025년 6월 말 기준 113개 세부 과제 중 총 91개의 세부 과제를 이행 완료하여 민선8기 구청장 공약 추진율은 **80.5%**로 2025년 1분기 대비 0.9%p 상승함.

※ '24년 4분기 78.1% → '25년 1분기 79.6% → '25년 2분기 80.5%


- 현재 추진 중인 22개 세부 과제 중 17개는 차질 없이 진행 중이나, 4개는 계획 대비 지연되어 '일부 추진'으로, 1개는 선행 단계가 지연되어 '보류'로 각각 이행 단계를 변경함.

※ 일부 추진: 4-53-1, 4-54-1, 4-55-1, 4-64-1 / 보류: 2-33-4

- 주관 부서에서는 관계기관과 지속적으로 협의하고, 공약 추진율 제고를 위해 사업 목표 조정 등 종합적인 검토가 필요함.

■ 추진 현황

(기준: 2025년 6월 말)

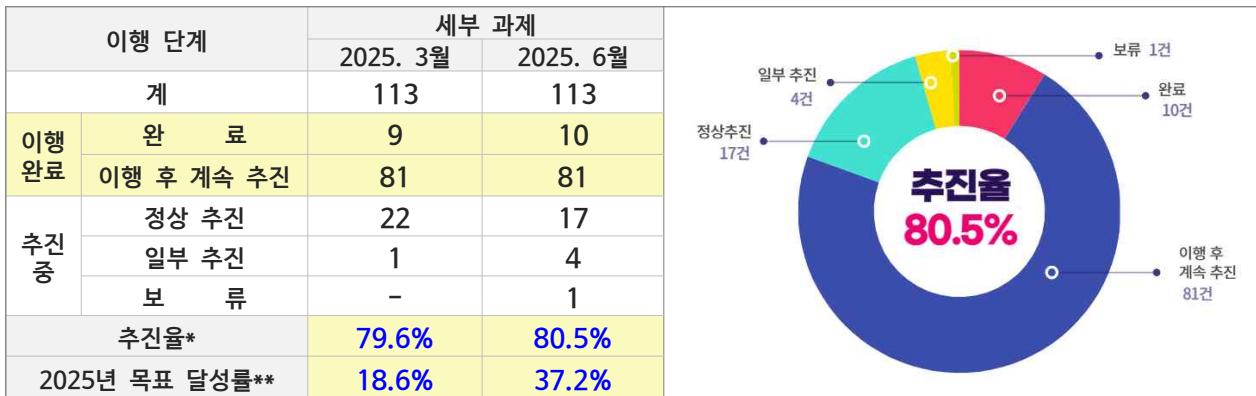

* 추진율: 이행 완료 세부 과제 / 전체 세부 과제(공약 폐기 1개 제외)

** 목표 달성률: 당해 목표 달성 세부 과제 / 전체 세부 과제(공약 폐기 1개 제외)

※ 공약이행도 구분 및 완료 세부 기준(한국매니페스토실천본부 기준)

이행 단계	내 용	공약 종류	완료 기준
완 료	공약 이행을 완료되어 종료된 사업	조성 사업	입법 및 재정확보 후 사업 개시(착공 시)
이행 후 계속 추진	공약 이행 완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업	건설 사업	
정상 추진	공약 내용 이행 완료 후 주기적으로 반복하는 사업	시설 유지 사업	입법 및 행정 결정 등 완료 시
일부 추진	임기종료 시점까지 이행 완료가 예상되는 사업	자본 유지 사업	양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작 되었을 경우
보 류	추진하고 있으나, 예상 목표 달성하지 못한 부진 사업	건립 공약 사업	건물이 완공 되었을 경우(착공은 정상 추진)
폐 기	사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업	재건축·재개발 사업	입주가 시작 되었을 경우(착공은 정상 추진)
	주변 여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업		

■ 분야별 추진 현황

(기준: 2025년 6월 말)

분야	계	이행 완료			정상 추진	일부 추진	보류	주요 변동 사항
		소계	완료	이행 후 계속 추진				
계	113	90	10	81	17	4	1	
변화의 중심 미추출구	28	15	3	12	13	-	-	[1-21-1] 정상 추진 → 완료
따뜻한 동행 미추출구	25	24	3	21	-	-	1	[2-33-3] 이행 후 계속 추진 → 완료 [2-33-4] 정상 추진 → 보류
꿈이 실현되는 미추출구	21	19	1	18	2	-	-	
건강과 안전지킴이 미추출구	31	26	3	24	-	4	-	[4-72-1] 정상 추진 → 이행 후 계속 추진 [4-53-1], [4-54-1], [4-55-1], [4-64-1] 정상 추진 → 일부 추진
구민과 공감하는 미추출구	8	6	-	6	2	-	-	

- 한국매니페스토실천본부 주관 ‘2025 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개평가’ 에서 **A(우수) 등급**을 받음.
 - 전반적인 공약 이행 관리에서 우수한 평가를 받았으나, 당해연도 목표 달성률이 타 지자체에 비해 낮아 전년도(SA등급)보다 등급이 한 단계 하락함. 2025년은 완료된 공약도 당해연도 목표 달성을 위해 부서의 지속적인 관심과 관리가 필요함.

□ 재정 현황: 4,992,245백만 원

- 2025년 3월 말(4,990,806백만 원) 대비 1,439백만 원 증가

※ 주요 변동 사항(2026년도 공모사업 선정, 그 외 추경 반영)

[1-9-1] 주민 공감 스마트시티 조성(10,198.8백만 원 → 11,618.8백만 원)

■ 자원별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	계	국비	시비	구비	기타	비고
투자계획	계	4,992,245	2,027,690	2,822,313	96,311	45,754
	입기 내	1,070,985	140,240	810,680	96,311	23,754
	입기 후	3,921,260	1,887,450	2,011,810	-	22,000
확보예산	345,214	53,053	215,828	68,590	7,743	

■ 분야별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	계	변화의 중심 미추출구	따뜻한 동행 미추출구	꿈이 실현되는 미추출구	건강과 안전지킴이 미추출구	구민과 공감하는 미추출구
투자계획	계	4,992,245	4,622,898	28,224	258,390	47,955
	입기 내	1,070,985	796,938	28,224	165,090	45,955
	입기 후	3,921,260	3,825,960	-	93,300	2,000
확보예산	345,214	180,965	21,936	86,485	32,681	23,147

IV

세부 점검 결과

□ 2025년 이행 완료 공약: 2건

- (1분기) **상생지원센터 설치**(경제지원과) [완료]
- (2분기) **취약계층 등 산후조리비용 지원**(건강증진과) [이행 후 계속 추진]
 - 2025년 2월 사업 개시, 2025년 6월까지 201건 지원하여 이행 완료로 변경(2025년도 목표 달성)

□ 일부 추진 공약: 4건

- | | |
|--|-------------|
| [4-53-1] 캠핑존, 바비큐 존 등 질 높은 휴식 공간 제공(문화예술과) | [추진율 20%] |
| [4-54-1] 반려동물 놀이터 설치(경제지원과) | [추진율 30%] |
| [4-55-1] 축구장 등 9개소 29면 조성, 실내체육관 건립, 파크골프장 조성(체육생활과) | [추진율 19.9%] |
| (실 적) 조성 전 선행 단계인 폐석회 매립 추진 중(99%) - 2025년 12월 말 완료 예정
(문제점) 부국사료 이전 보상 등으로 폐석회 매립이 지연되어 사업 기간 연장됨(2026년 → 2027년)
2026년 상반기 유원지 조성계획 변경 예정
[4-55-1] 실내체육관의 경우, '25. 2월 건립 계획이 중단됨
→ 공약 목표, 추진계획, 확인지표 등 전반적인 공약 조정에 대해 검토 요청 | |
| [4-64-1] 용현5동 SK뷰 맞은편 생태공원 유치 추진(공원녹지과) | [추진율 10%] |
| (실 적) 복합문화시설 등 인천시에서 관련 부서의 사업 방향 검토 진행 중
(문제점) 기존 추진사업(청년드림촌)에 대한 계획 변경 필요, 부지 내 오염토에 대한 책임 문제 등
→ 인천시와 지속적인 협의 및 모니터링하여 市の 사업 방향 파악 요청
→ 공약 목표, 대상지 변경 등 추진계획, 확인지표 등 전반적인 공약 조정에 대해 검토 요청 | |

□ 보류 공약: 1개

- | | |
|--|-----------|
| [2-33-4] 발달장애인 평생교육센터 설치(노인장애인복지과) | [추진율 40%] |
| (문제점) 선행 단계인 주안노인문화센터 이전 신축이 인허가 등으로 지연되고 있어 향후 추진 일정 현재 미정
→ 공약 추진에 대해 목표 변경 등 공약 조정(변경, 폐지) 다각적으로 검토 요청 | |

□ 정상 추진 공약: 17개

- 국가, 인천시가 사업 주체인 세부 과제는 추진 상황 등에 대해 인천시 등과 지속적인 협의 및 모니터링 필요

[1-2-1] 동서 간 도시단절 해소, 도심 숲 조성, 시민 휴식 공간 제공, 주차장 조성(도시재생과) [추진율 30%]

(목 표) ('22년) 일반화 1-1단계 착공 ('23년) 일반화 1-2단계, 2단계 착공
('24년) 지하도로화 1단계 착공 ('25년) 일반화 1-1, 1-2단계 준공 ('26년) 공사 추진

(실 적) ('22년) 일반화 1-1단계 착공 ('24년) 일반화 1-2단계 착공

→ 일반화 1-1단계, 1-2단계가 각각 2026년, 2027년 준공 예정으로 현재 계획 대비 **전체 일정이 지연되었으며**, 2023년 착공 계획이었던 **일반화 2단계 또한 지하도로화 1단계와 통합 추진되면서** 2025년 8월 착공으로 일정이 변경됨

→ **공약 목표 재설정 및 확인지표 변경 검토 요청**

[1-15-1] 지방산업단지 고도화 사업 추진(경제지원과) [추진율 60%]

(목 표) ('24년) 인천기계산단 도시재생활성화계획 승인 고시, 뉴딜사업/재생사업 추진

(실 적) (인천지방.기계산단) 제영향평가 용역 시행, (주안국가산단) 타당성 검증 등

→ 당초 계획했던 2023년 인천기계산단 도시재생활성화계획이 중복 등의 문제로 반려되어 경쟁력 강화사업 지구 재생사업으로 변경되었으며, 사업 승인도 2026년 상반기(인천기계산단), 2025년 하반기(주안국가산단)로 지연됨

→ **공약 사업계획, 확인지표 등 변경 검토 요청**

관리번호	세부 과제	주관 부서	추진율	완료시기
1-1-1	[국가] 남북 간 도시단절 해소, 상부공간 공원, 상업, 주거(역세권 청년임대주택 포함) 등 생활시설과 업무시설 배치	교통행정과	60%	2026년(1단계)
1-2-1	[시] 동서 간 도시단절 해소, 도심 숲 조성, 시민 휴식 공간 제공, 주차장 조성	도시재생과	30%	임기 후
1-3-1	[시] 인हा대역~인천터미널역 지하철 노선 신설 추진	교통행정과	60%	2025년 12월
1-4-1	[시] 문학IC~도화C 지하도로 건설 추진	건설과	60%	2026년(1단계)
1-5-1	[시] 월판선 인천역까지 연장 추진(승의역 정차)	교통행정과	60%	2026년(1단계)
1-6-1	[국가] 송도~제물포역 교통체계 개선	교통행정과	60%	2026년(1단계)
1-10-1	주안2·4동 재정비촉진사업 신속 추진	도시재생과	70%	2025년 8월
1-11-1	[시] 인천대로 연계 주변 재생사업 적극 추진	도시재생과	60%	2026년
1-12-1	[시] 제물포 Station-J 뉴딜사업 추진	도시재생과	60%	2026년
1-12-2	[시] 공공주도 3080+ 도심공공주택 복합사업 추진	도시정비과	30%	임기 후
1-13-2	도심 전선 지중화 사업 확대	건설과	62%	2026년 착공 시
1-15-1	[시] 지방산업단지 고도화 사업 추진	경제지원과	60%	2025년
1-19-1	지역경제 활성화 관련 사업 추진(일자리 포함)	경제지원과	98%	2025년 목표달성 시
3-47-1	[시] 개발사업구역 내 뮤지엄파크 조성	문화예술과	70%	임기 후

관리번호	세부 과제	주관 부서	추진율	완료시기
3-48-1	수봉공원 내 스카이 워크 조성 추진	공원녹지과	40%	2025년 12월
5-74-1	미추홀구 세무서 설치 추진	세무2과	70%	2026년
5-79-1	인천고등법원 유치	기획예산실	75%	2026년

□ 이행 완료한 공약 중 2025년도 목표 미달성 공약: 52개(붙임 참고)

- 시기 미도래로 6월 말 기준 2025년도 목표 미달성한 공약: 19개
- 이외 연내 목표 달성할 수 있도록 차질 없이 진행 요청

<p>[1-14-1] 노후 산업단지 구조고도화 및 환경개선사업 추진 (경제지원과) (목 표) 환경개선사업 추진 및 발굴 1건 (실 적) 0건 (문제점) 지속적인 건의사항으로 인천시 추가적인 요청 한계 → 환경개선사업 추진 및 발굴: 현장 순찰 및 인천시에 요청한 실적 등 반영 검토</p>	(경제지원과)
<p>[1-16-1] 미추홀구 기업에 맞는 일자리 발굴 및 교육으로 지역맞춤형 일자리 창출 (일자리정책과) (목 표) 일자리발굴단 20회 운영 (실 적) 일자리발굴단 8회 운영 (대 책) 일자리발굴단 집중 운영 - 월 2~3회 → 11월 목표 달성 예정</p>	(일자리정책과)
<p>[1-22-1] 관내 소상공인 직업능력개발 계획 수립으로 업종전환 및 재취업 지원 확대 (경제지원과) (목 표) 컨설팅 10개소, 재취업·재창업 교육 20개소 (실 적) 컨설팅 5개소, 교육 0개소 → 소상공인 재취업·재창업 교육 타 기관 사업 연계 불가 시 공약 조정 요청</p>	(경제지원과)
<p>[2-25-1] 아이사랑꿈터 확충 (보육정책과) (목 표) 9호점 확충 (실 적) 1차 추경 시 예산 확보 → 연말까지 9호점 개소를 위한 시설확보 및 운영 위탁 완료 요청</p>	(보육정책과)
<p>[3-45-1] 청년 일자리 종합지원 사업-빈집을 활용한 청년 창업촌 조성 (일자리정책과) (목 표) 신규 조성 1개소, 운영 16개소 (실 적) 신규 조성 0개소, 운영 12개소 → 창업점 위치 조정, 운영 규모 조정에 따라 확인지표 변경 검토</p>	(일자리정책과)
<p>[4-62-1] 도심지 내 공원 조성 추진 (공원녹지과) (목 표) 리모델링 1개소, 장기미집행 공원 조성 1개소 (실 적) 리모델링 0개소, 공원 조성 0개소 → 장기미집행 공원 조성 미추진 시 확인지표 변경</p>	(공원녹지과)

V

구청장 당부사항

- 민선8기 남은 기간이 많지 않은 만큼, 각 부서에서는 공약의 실현 가능성을 면밀히 검토하고, 이행가능한 과제는 반드시 마무리할 수 있도록 추진할 것.
- 공약은 단순한 정책이 아니라 주민 편의와 삶의 질에 직결되는 약속임을 인식하고, 책임감을 가지고 끝까지 추진하기를 바람.
- 다만, 계획만을 고집하기보다는 실효성 있는 방향으로 유연하게 조정할 수 있도록 검토할 것.
 - 반려동물 놀이터, 캠핑존 등 DCRE와 관련된 사업, 용현5동 SK뷰 맞은편 생태공원 유치 등 추진이 어려운 과제는 현실적인 대안 마련 또는 위치·방식 변경 등 조정 방안을 적극 모색할 것.
- 공약 추진률은 다른 지자체에 비해 높은 편이나, 당해연도 목표 달성률이 낮아 전체 성과에 영향을 줄 수 있음.
 - 연내 성과 확보를 위해 속도감 있는 추진과 부진 과제에 대한 집중 관리가 필요함.

VI

행정사항

- 공약사업의 지속적인 관리 추진 노력(전 부서) : 연중
 - (공통) 공약 추진 사항 관리카드 작성 및 관리 철저
 - (완료 부서) 2025년도 목표 달성 관리 철저
 - (추진 중 부서)
 - 사업 주체가 우리 구가 아닌 경우, 지속적인 모니터링 추진
 - 2025년 이행 완료 예정인 세부 과제

관리번호	세부 과제명	추진율	주관 부서	비고
1-3-1	인하대역~인천터미널역 지하철 노선 신설 추진	30% → 60%	교통행정과	4분기 예정
1-10-1	주안2.4동 재정비촉진사업 신속 추진	70%	도시재생과	2분기 → 3분기
1-19-1	지역경제 활성화 관련 사업 추진	90% → 98%	경제지원과	목표 달성 시
1-21-1	상생지원센터 설치 추진	100%	경제지원과	1분기 완료
3-48-1	수봉공원 내 스카이워크 조성 추진	30% → 40%	공원녹지과	4분기 예정
4-72-1	취약계층 등 산후조리비용 지원	100%	건강증진과	2분기 완료

□ 공약 추진 현황 게시(스마트정책실) : 2025. 8월 중

- 구 홈페이지 및 데이터 통합 플랫폼 게시

□ 민선8기 미추홀구 공약이행평가단 공약 조정 심의: 2025. 11월 중

- 조정절차



- 조정대상

- 불가피한 사유(법령 개정이나 정책 변화 등 외적 환경 변화)로 조정이 필요한 공약

세부 과제	주관 부서	세부 과제	주관 부서
[1-2-1] 동서 간 도시단절 해소, 도심 숲 조성, 시민 휴식공간 제공, 주차장 조성	도시재생과	[4-53-1] 캠핑존, 바비큐 존 등 질 높은 휴식 공간 제공	문화예술과
[1-15-1] 지방산업 고도화 사업추진	경제지원과	[4-54-1] 반려동물 놀이터 설치	경제지원과
[2-33-4] 발달장애인 평생교육센터 설치	노인장애인복지과	[4-55-1] 축구장 등 9개소 29면 조성, 실내체육관 건립, 파크골프장 조성	체육생활과
[3-45-1] 청년 일자리 종합지원 사업 - 빈집을 활용한 청년 창업촌 조성	일자리정책과	[4-62-1] 도심지 내 공원 조성 추진	공원녹지과

※ 市 공약 조정에 따라 시기, 대상 등 변경될 수 있음

- 붙임 1. 공약사항 분야별 세부 현황 1부.
2. 공약 추진사항 관리카드 각 1부.
3. 민선8기 공약사항 예산 현황 1부.
4. 공약 조정 요청서 1부. 끝.
